

OAX. E.C. (Mitla - Tehuantepec II) - Santiago Quiavicusas

Características de la obra:

- Se ubica en el municipio de San Carlos Yautepec, al sureste del estado de Oaxaca, tiene una longitud de 23.4 km, que requieren trabajos de modernización.

FALTANTE DE MODERNIZAR 1.5 KM


MONTO Y META TOTAL	87.8 MDP	23.4 KM
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (m)
2020	24.4	11.4
2021	35.4	10.5
PEF 2022	28.0	1.5

Avances acumulados a nivel de subrasante al 28 de febrero de 2022

Avance físico:	93.6 %
Avance financiero:	68.1 %

Elementos TELAS

Técnica (Proyecto Ejecutivo)	100.0 %
Económica (Registro UI-SHCP)	Vigente (17096400002)
Legal (Derecho de Vía)	100.0 %
Ambiental	100.0 %
Social	Sin problema

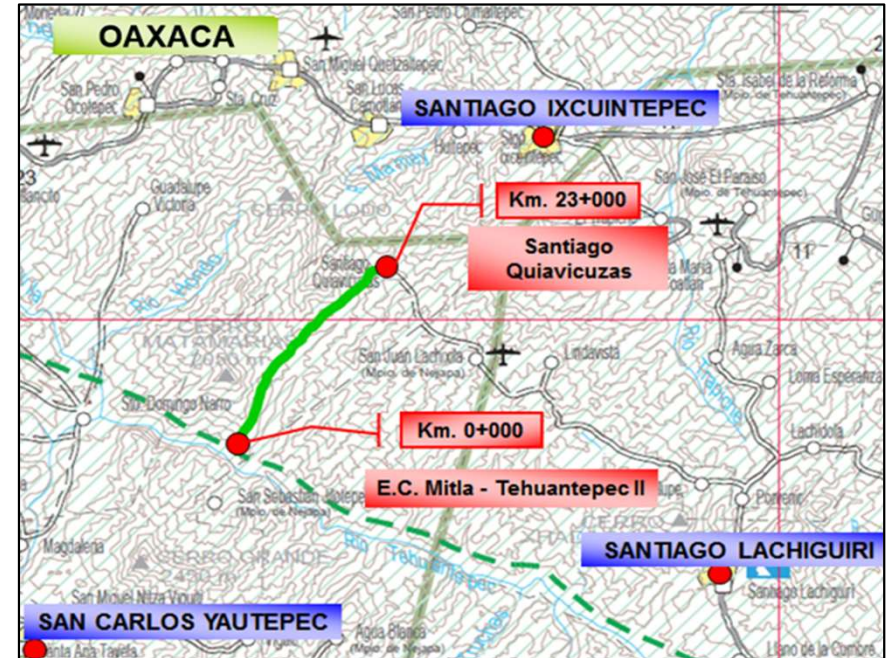

- Su modernización se realiza a nivel de subrasante.
- En **2022** se tienen contratados **1.5 km**, con periodo de ejecución del 9 de marzo al 06 de julio de 2022.

Beneficios

- Disminuir la marginación de la región.
- Integrar las comunidades aisladas en la región para su desarrollo económico y social.
- La población beneficiada es de 1,468 habitantes de la cabecera municipal y localidades.
