

Características de la obra:

- Esta ubicado en el Municipio de Centla en el Estado de Tabasco, y cuenta con una longitud total de 836.0 m (440.0 m puente) incluyendo accesos.

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE QUINTÍN ARAUZ CON 836 METROS INCLUYENDO ACCESOS.

MONTO Y META TOTAL		467.1 MDP	836.0 M
EJERCICIO FISCAL		ASIGNACIÓN ( mdp )	META ( m)
Plurianualidad 2021		59.4*	836.0
Plurianualidad 2022	PEF 2022	190.0	
	Adicional PG	217.7	


PG: Presión de gasto 2022, a la fecha no dispone de suficiencia.

Avances acumulados al 28 de febrero de 2022

Avance físico:	7.5 %
Avance financiero:	30.7 %

Elementos TELAS

Técnica (Proyecto Ejecutivo)	100.0 %
Económica (Registro UI-SHCP)	Vigente (20096470001)
Legal (Derecho de Vía)	100.0 %
Ambiental	100.0 %
Social	Sin problema

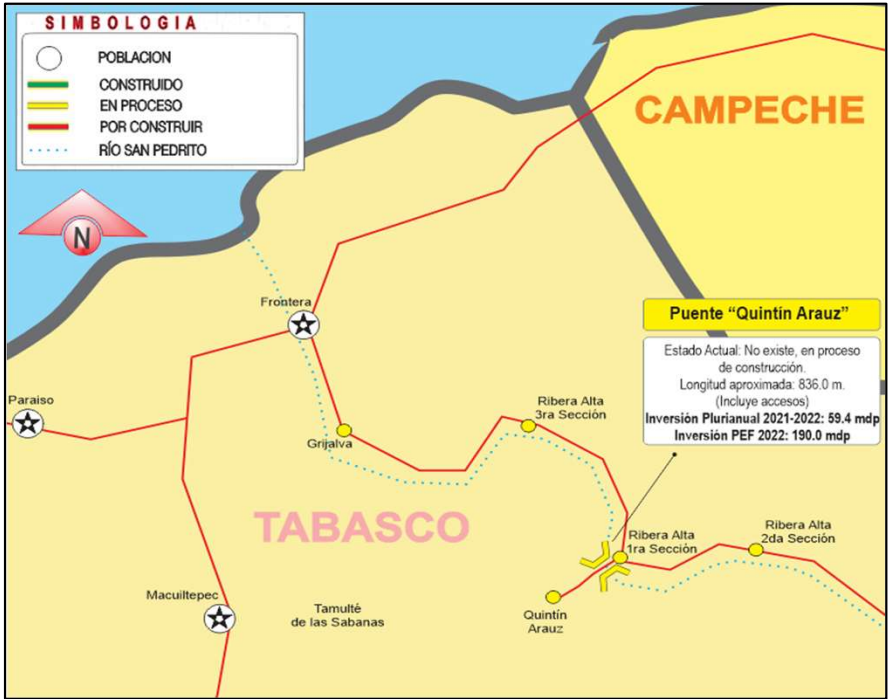

- Se contrató de manera plurianual 467.1 mdp, con periodo de ejecución del 15 de diciembre de 2021 al 01 de diciembre de 2022.

Beneficios

- Se logrará el traslado seguro hacía la red modernizada que conecta a la cabecera municipal de Centla.
- La población beneficiada es de 2,611 habitantes de la cabecera municipal de Centla y localidades aledañas al camino.
- Se reducirá el tiempo de recorrido de 25 a 5 minutos.
