

OAX. E.C. (Mitla - Tehuantepec II) - San Juan Lachixila.

Características de la obra:

- Se ubica en el municipio de Nejapa de Madero, al sureste del estado de Oaxaca, tiene una longitud de 22.0 km, que requieren trabajos de modernización.

FALTANTE DE MODERNIZAR 2.0 KM


MONTO Y META TOTAL	49.3 MDP	22.0 KM
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (m)
2020	24.5	16.5
2021	14.8	3.5
PEF 2022	10.0	2.0

Avances acumulados a nivel de subrasante al 28 de febrero de 2022

Avance físico:	90.9 %
Avance financiero:	79.6 %

Elementos TELAS

Técnica (Proyecto Ejecutivo)	100.0 %
Económica (Registro UI-SHCP)	Vigente (17096400002)
Legal (Derecho de Vía)	100.0 %
Ambiental	100.0 %
Social	Sin problema

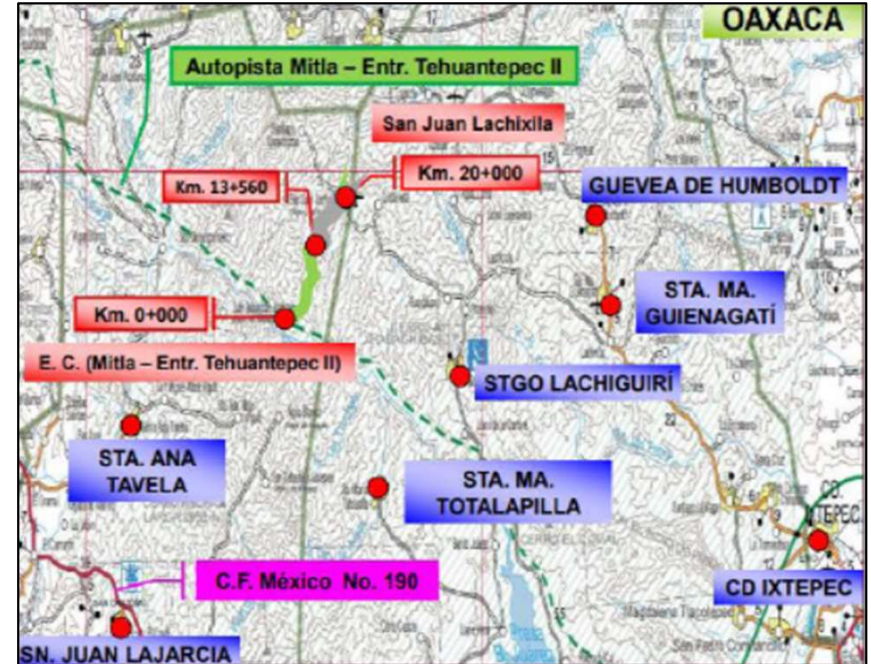

- Su modernización se realiza a nivel de subrasante.
- Su pavimentación se realizará a través del U004.
- En **2022** se tienen contratados **2.0 km**, con periodo de ejecución del 1 de abril al 28 de agosto de 2022.

Beneficios

- Disminuir la marginación de la región.
- Integrar las comunidades aisladas en la región para su desarrollo económico y social.
- La población beneficiada es de 494 habitantes de la cabecera municipal y localidades.
