

Características de la obra:

- Esta ubicada en el municipio de La Yesca, al sureste del estado de Nayarit y cuenta con una longitud total de 163.4 km, de los cuales a la fecha se tienen a nivel de pavimento 116.2 km.

MODERNIZACIÓN DE 67.2 KM, DEL KM 96+200 AL KM 163+400.

MONTO Y META TOTAL		480.0 MDP	163.4 KM
EJERCICIO FISCAL		ASIGNACIÓN (mdp)	META (km)
Hasta 2020		0.0 (Modernizado C.F.E.)	96.2
2021	PEF	146.4	20.0
	Plurianualidad	34.1	7.6
2022	Plurianualidad	27.9 *	
	PEF	255.5 *	39.6
Adicional		16.1	Trabajos complementarios

Avances acumulados al 31 de enero de 2022

Avance físico:	73.0 %
Avance financiero:	37.6 % *


*No incluye el monto de los 96.2 km pavimentados por C.F.E.

* PPEF 2022 283.4 mdp

Se tiene programada su conclusión para el ejercicio 2022.

Estrategia de modernización:

- Su modernización se realiza a nivel de pavimento asfáltico.
- Se contrató de manera plurianual 62.0 mdp, con periodo de ejecución del 22 de octubre de 2021 al 03 de junio de 2022.

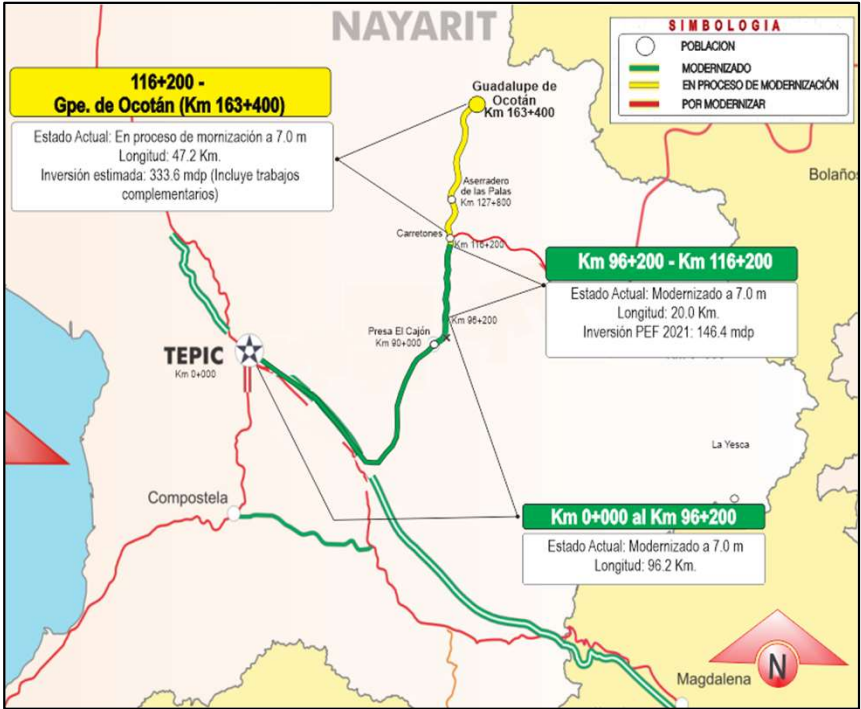

- De los recursos pendiente de compromiso del presente ejercicio, se tienen en proceso de licitación, los cuales su apertura se tiene programada para el 11 de febrero de 2022.

Beneficios:

- Se integra un eje en el sureste del estado de Nayarit.
- La población beneficiada es de 1,210 habitantes de la región de la Yesca y localidades aledañas al camino.
- Se reducirá el tiempo de recorrido de 3 horas y media a 1 hora 15 minutos.
