

Características de la obra:

• Esta ubicada en el Municipio de La Yesca, al sureste del Estado de Nayarit y el tramo a modernizar cuenta con una longitud total de 67.5 km (del km 120+400 al km 187+900), de los cuales, se han modernizado a nivel de pavimento 39.5 km.


FALTANTE DE MODERNIZAR 28.0 KM, DEL KM 120+400 AL KM 148+400.

MONTO Y META TOTAL		568.5 MDP	67.5 KM
EJERCICIO FISCAL		ASIGNACIÓN (mdp)	META (km)
Hasta 2020		0.0 (Modernizado Gob. del Edo.)	39.5
2021	PEF	0.1	-
	Plurianualidad	38.4	16.0
2022	Plurianualidad	145.5	16.0
	PEF	284.5	12.0
	Adicional PG	100.0	Ramal a Hujimic

PG: Presión de gasto 2022, a la fecha no dispone de suficiencia.

Avances acumulados al 28 de febrero de 2022			
Avance físico:	64.4 %		
Avance financiero:	6.8 %*		
*No incluye el monto de los 39.5 k	m pavimentados por Gob. Edo.		

Elementos TELASTécnica (Proyecto Ejecutivo)100.0 %Económica (Registro UI-SHCP)Vigente (20096380001)Legal (Derecho de Vía)100.0 %AmbientalMIA 100.0 %, CUS 100 % (autorización provisional)SocialSin problema

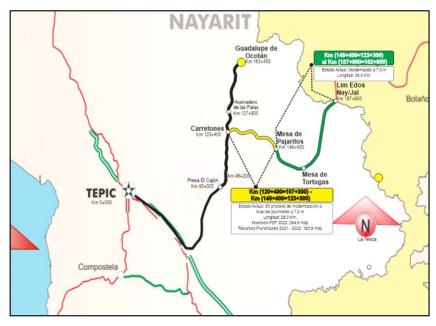

- Se contrató de manera plurianual 183.9 mdp, con periodo de ejecución del 01 de noviembre de 2021 al 28 de julio de 2022.
- Los recursos PEF 2022, se tienen en proceso de licitación, las propuestas se encuentran en revisión para emitir su fallo.

Beneficios

- Se integra un eje interestatal que unirá el Pacífico Mexicano con la región Central del País.
- La población beneficiada es de 4,249 habitantes de la Región de la Yesca y localidades aledañas al camino.
- Se reducirá el tiempo de recorrido de 1 hora y media a 30 minutos.
