


Características de la obra:

- Construcción de un ramal y entronque, de una sección de 9.0 m de ancho para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 m (uno por sentido), con acotamientos externos de 1.0 m. entre el entronque Guadalupe Victoria I ubicado en el km 70+000 de la autopista Durango – Yerbanís y la carretera federal Guadalupe Victoria en el km 74+800, en el estado de Durango.

OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN			
MONTO Y KILÓMETROS TOTALES	154.9 MDP SIN IVA	179.7 MDP CON IVA	4.0 KM
Hasta 2021	105.3	122.2	3.5
2022	49.6	57.5	0.5

Avances acumulados al 28 de febrero 2022			
Avance físico:	138.72 MDP	160.92 MDP	89.5%
Avance financiero:	138.72 MDP	160.92 MDP	89.5 %

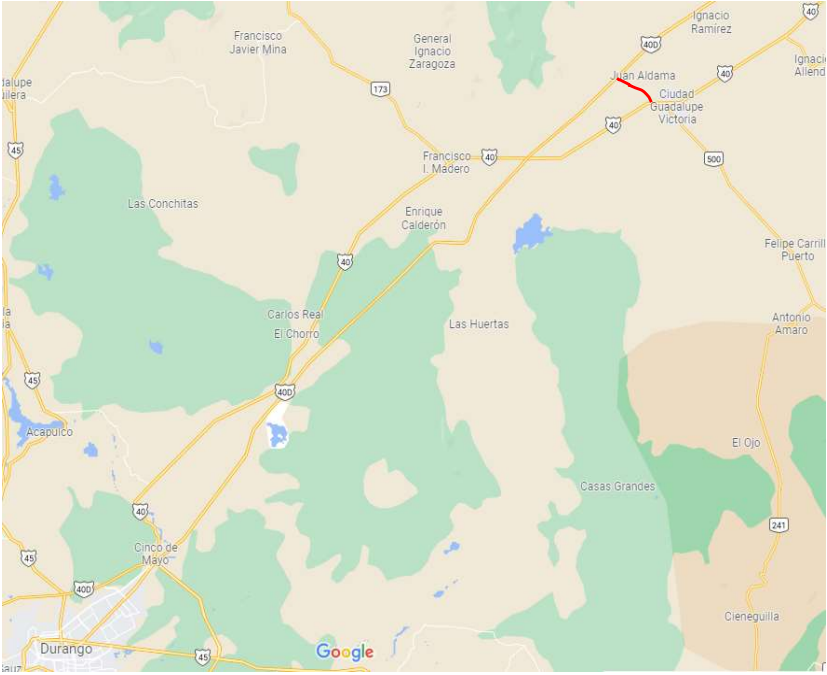

Beneficios:

- El Proyecto tiene como objetivo mejorar la conectividad en la zona y, en específico, ofrecer una comunicación directa hacia el poblado Guadalupe Victoria.
- Se estiman ahorros promedio de 20 minutos, evitando ingresar desde el entronque ubicado en el km 59 de la autopista Durango-Yerbanís.

Nota: Se han concluido los trabajos de tendido de carpeta en la superficie de rodamiento..

La Concesión tiene la finalidad de construir un Ramal que conecte con el poblado de Guadalupe Victoria, desde la autopista Durango-Yerbanís.
