

Características de la obra:

- Esta ubicada en los municipios de Ayutla de los Libres, Atlixnac y Acatepec del estado de Guerrero. Cuenta con una longitud total de 28.0 km.


FALTANTE DE MODERNIZAR 17.8 KM, DEL KM 10+200 AL KM 28+000.

MONTO Y META TOTAL		280.0 MDP	28.0 KM
EJERCICIO FISCAL		ASIGNACIÓN ( mdp )	META ( km )
Hasta 2020		0.0 (Modernizado Gob. del Edo.)	6.2
2021	PEF	48.3	4.0
	Plurianualidad	18.4	17.8
2022	Plurianualidad	186.2	
	PEF	26.0	
Adicional		1.1 *	Trabajos complementarios

\* No dispone de suficiencia.

Avances acumulados al 28 de febrero de 2022	
Avance físico:	46.6 %
Avance financiero:	34.5 %

Elementos TELAS	
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	100.0 %
Económica (Registro UI-SHCP)	Vigente (10096320017)
Legal (Derecho de Vía)	100.0 %
Ambiental	MIA 100.0 %, CUS 100 % (autorización provisional)
Social	Sin problema

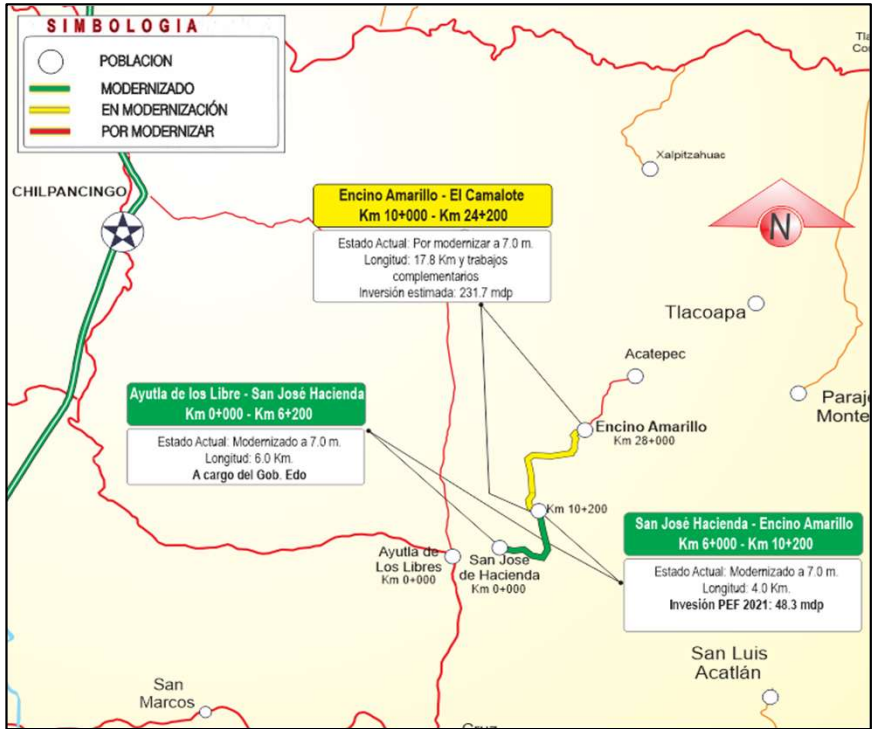

- Se contrató de manera plurianual 204.6 mdp, con periodo de ejecución del 01 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022.

Beneficios

- La población beneficiada es de 8,148 habitantes de las cabeceras municipales de Ayutla de los Libres, Acatepec, Atlixnac, Acatepec y localidades aledañas al camino.
- Se reducirá el tiempo de recorrido de 1 hora a 20 minutos.
