

## Características de la obra:

 Ubicada en el noreste del Estado de Sonora, en la frontera con los Estados Unidos de América, en los municipios de Agua Prieta y Bavispe y cuenta con una longitud total de 135.0 km, de los cuales se han modernizado 32.0 km a nivel de pavimento.


## FALTANTE DE MODERNIZAR 76.5 KM Y LA CONSTRUCCIÓN DE 9 PUENTES

MONTO Y META TOTAL		1,479.1 MDP	135.0 KM
EJERCICIO FISCAL		ASIGNACIÓ N( mdp )	META ( km - estructura )
Hasta 2020		127.8	25.0 km y Puente Cuchuverachi
2021	PEF	496.8	36.0 km y 16 puentes
	Plurianualidad	36.4	F/ 0
2022	Plurianualidad	392.8 +	54.0
	PEF	355.3 +	20.0 y 9 puentes
	Adicional PG	70.0	

PG: Presión de gasto 2022, a la fecha no dispone de suficiencia.

<sup>+</sup> **PEF 2022**: 748.2 MDP

Avances acumulados al 28 de febrero de 2022			
Avance físico:	<b>47.2</b> %		
Avance financiero:	51.7 %		
Elementos TELAS			
<b>Técnica</b> (Proyecto Ejecutivo)	100.0 %		
Económica (Registro UI-SHCP)	Vigentes (14096460006, 20096460003, 20096460001 y 20096460002)		
<b>Legal</b> (Derecho de Vía)	100.0 %		
Ambiental	100.0 %		
Social	Sin problema		

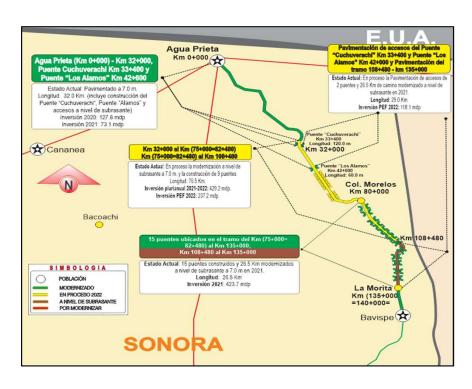

- Se contrató de manera plurianual 429.2 mdp, con periodo de ejecución del 01 de diciembre de 2021 al 15 de agosto de 2022.
- Los recursos PEF 2022 se tienen en proceso de licitación, su fecha de apertura se tiene programada para el 9 de marzo de 2022.

## **Beneficios**

- Se integra un nuevo eje estatal longitudinal.
- La población beneficiada es de 77,756 habitantes de los municipios de Agua Prieta, Bavispe y las localidades aledañas al camino.
- Se reducirá el tiempo de recorrido de 3 horas y media a 1 hora 15 minutos.
