

Características de la obra:

- Se ubica en los municipios de San Ignacio (Sinaloa) y San Dimas (Durango), cuenta con una longitud total de 103.0 km, 15.5 km se tienen modernizados a nivel de pavimento, 85.4 km operan como camino rural revestido, incluye 12.1 km aperturados en 2019 – 2021:
 - En 2019: 1.3 km con 49.5 mdp.
 - En 2020: 2.1 km con 99.0 mdp.
 - En 2021: 8.7 km 258.8 mdp.

Por lo que, se tienen pendientes de aperturar 2.1 km, la construcción de 5 puentes y la estabilización de taludes con una inversión de 363.3 mdp.


FALTANTE DE APERTURAR 2.1 KM EN SINALOA DEL 87+700 AL 89+800 Y CONTRUIR 5 PUENTES

MONTO Y META TOTAL		770.5 MDP	14.2 KM
EJERCICIO FISCAL		ASIGNACIÓN (mdp)	META (km)
Hasta 2020		148.5	3.4
2021	PEF	258.7	8.7
	Plurianualidad	12.2	21v E puentos
2022	Plurianualidad	141.2	2.1 y 5 puentes
	PEF	209.9	Estabilización de taludes

Avance Global al 28 de febrero de 2022 Avance físico: 87.3%

Avance financiero:	59.7 %

Elementos TELAS				
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	100.0 %			
Económica (Registro UI-SHCP)	Vigente (19096450002)			
Legal (Derecho de Vía)	100.0 %			
Ambiental	100.0 %			
Social	Sin problema			

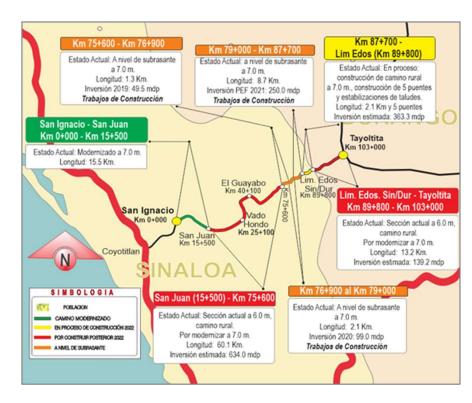

 Se contrató de manera plurianual 153.4 mdp, con periodo de ejecución del 26 de octubre de 2021 al 10 de noviembre de 2022.

Beneficios

- Se integra un eje transversal en el noreste del país.
- Población Beneficiada: 11,131 habitantes, de los municipios de San Ignacio (Sin) y San Dimas (Dgo).
- El tiempo de recorrido se disminuirá de 12 a 2 horas.
