

Características de la obra:


• Esta ubicada en los Municipios de Canelas y Tamazula, en el estado de Durango. Cuenta con una longitud total de 292.4 km.

3 VIADUCTOS Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.			
MONTO Y META TOTAL		2,666.6 MDP	292.4 KM
EJERCICIO FISCAL		ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2020		1,590.8	284.4 km (incluye una estructura)
2021	PEF	450.6	8.0 km y 7 puentes
	Plurianualidad	25.2	3 viaductos y
2022	Plurianualidad	20.0	estabilización de
	PEF	280.0	taludes
	Adicional PG	300.0	Estabilización de taludes

PG: Presión de gasto 2022, a la fecha no dispone de suficiencia.

Avances acumulados al 28 de febrero de 2022			
Avance físico:	99.1 %		
Avance financiero:	76.9 %		

Elementos TELAS			
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Camino 100.0 %, Estudios de estabilización de 37 taludes 70 %		
Económica (Registro UI-SHCP)	Vigente (19096450002)		
Legal (Derecho de Vía)	100.0 %		
Ambiental	100.0 %		
Social	Sin problema		

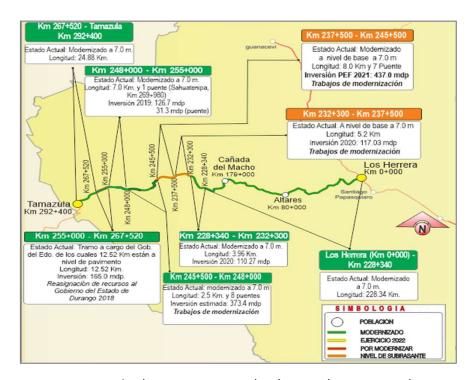

- Se contrató de manera plurianual 45.2 mdp, con periodo de ejecución del 01 de noviembre de 2021 al 31 de agosto de 2022.
- Los recursos PEF 2022 se tienen en proceso de licitación, su fecha de fallo se tiene programada para el 18 de marzo de 2022.

Beneficios

- Se integra un eje transversal en el norte del país.
- Población beneficiada, 5,516 habitantes de los municipios de Los Herrera y Tamazula, en el estado de Durango.
- Se reducirá el tiempo de recorrido de 14 horas a 5 horas 30 min.
