## SIN. Badiraguato – Guadalupe y Calvo (Badiraguato –

Caminos Rurales y Alimentadore



## Características de la obra:


Los Frailes)

- Esta ubicada en los Municipios de Badiraguato en el Estado de Sinaloa y Guadalupe y Calvo del estado de Chihuahua, cuenta con una longitud total de 140.0 km.
- Hasta 2021 se modernizaron 134.3 km, quedando pendientes de modernizar a nivel de pavimento 5.7 km, de los cuales
  2.0 Km están a cargo del Gobierno del estado de Sinaloa (del km 96+00 al 98+000).

FALTANTE DE MODERNIZAR 3.7 KM				
MONTO Y META TOTAL		2,167.0 MDP	140.0 KM	
EJERCICIO FISCAL		ASIGNACIÓN ( mdp )	META ( km )	
Hasta 2020		1,329.2	120.9	
2021	PEF	448.3	13.4	
	Plurianualidad	51.7	3.7	
	Plurianualidad	43.3	3.7	
2022	PEF	294.5	Estabilización de taludes	
	Gob. del Edo.		2.0	

Avance Global al 28 de febrero de 2022			
Avance físico:	96.4 %		
Avance financiero:	84.9 %		

Elementos TELAS			
<b>Técnica</b> (Proyecto Ejecutivo)	Camino 100.0 %, Estudios Estabilización de 13 taludes 80 %		
Económica (Registro UI-SHCP)	Vigente (18096450001)		
<b>Legal</b> (Derecho de Vía)	100.0 %		
Ambiental	100.0 %		
Social	Sin problema		

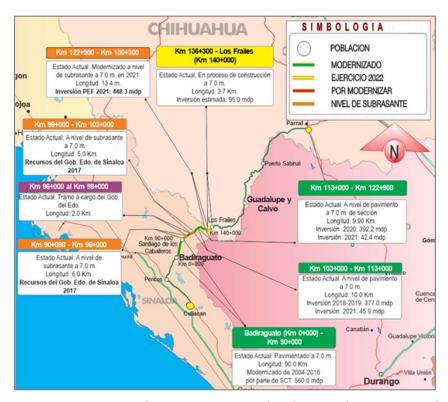

 Se contrató de manera plurianual 95.0 mdp, con periodo de ejecución del 26 de octubre de 2021 al 10 de noviembre de 2022

## **Beneficios**

- Se integra un eje transversal en el noreste del país.
- La población beneficiada es de 917,011 habitantes de los municipios de Badiraguato y Guadalupe y Calvo.
- Se reducirá el tiempo de recorrido de 7 horas 15 minutos a 2 horas 25 minutos.
