VER. Zontecomatlán - Xoxocapa - Ilamatlán

PEF 2022

Caminos Rurales y Alimentadores



Características de la obra:


 Esta ubicada en los municipios de Zontecomatlán de López y Fuentes e Ilamatlán del estado de Veracruz, cuenta con una longitud total de 33.4 km y opera como un camino rural de 4.5 m de ancho aprox.

MODERNIZACIÓN DE 33.4 KM, DEL KM 0+000 AL KM
33+400.

MONTO Y META TOTAL		213.0 MDP	33.4 KM
EJERCICIO FISCAL		ASIGNACIÓN (mdp)	META (km)
Hasta 2020		0.0	0.0
2021	PEF	53.3	7.5
	Plurianualidad	39.7	16 5
	Plurianualidad	111.2	16.5
2022	PEF	8.8	Trabajos complementarios
	Gob. del Edo.		9.4

Avances acumulados al 28 de febrero de 2022			
Avance físico:	36.9 %		
Avance financiero:	50.9 %		

Elementos TELAS			
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	100.0 %		
Económica (Registro UI-SHCP)	Vigente (20096500001)		
Legal (Derecho de Vía)	100.0 %		
Ambiental	MIA 100.0 %, CUS 100 % (autorización provisional)		
Social	Sin problema		

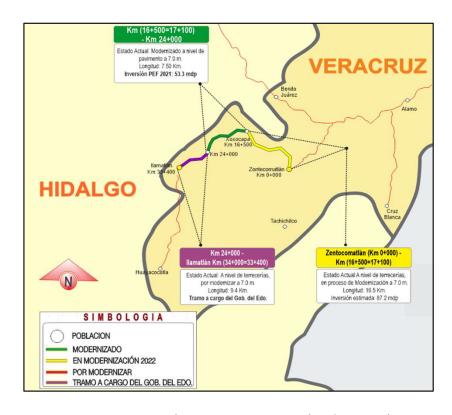

 Se contrató de manera plurianual 150.9 mdp, con periodo de ejecución del 15 de octubre al 09 de septiembre de 2022.

Beneficios

- La población beneficiada es de 5,926 habitantes de las cabeceras municipales de Zontecomatlán de López y Fuentes e llamatlán y localidades aledañas al camino.
- Se reducirá el tiempo de recorrido de 1 hora 45 minutos a 38 minutos.
