SLP. Modernización de la carretera federal Mex- 085

Portezuelo – Cd. Valles, Tramo: Cd. Valles – Tamazunchale, Obra en proceso




Características de la obra:

 Ampliación del cuerpo existente a una sección de 22.0 m de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación, dos por sentido.

MODERNIZAR 89.73 KM, 20 PUENTES y 3 ENTRONQUES		
MONTO Y META TOTAL	5,087.0 MDP	89.73 Km, 20 puentes Y 3 entronques
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2021	978.5	16.6 km, 3 puentes
PEF 2022	975.0	14.9 Km
Posterior 2022	3,133.5	58.23, 17 puentes y 3 Entronques

Avance Global al 28 de febrero de 2022		
Avance físico:	18.5 %	
Avance financiero:	19.9 %	

Elementos TELAS		
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	En elaboración por parte del CSCT	
Económica (Registro UI-SHCP)	Vigente hasta 2023 (17096440002)	
Legal (Derecho de Vía)	Histórico. LDV adicional a cargo del CSCT	
Ambiental	MIA Regional y ETJ, en proceso por parte del CSCT	
Social	Sin problemática	

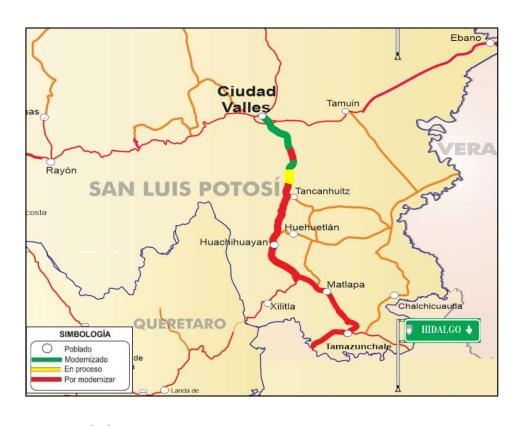

Beneficios

- Mejora la interconexión de las Carreteras Federales MEX-85 y MEX-70.
- Se beneficia a una población de 367,097 habitantes en los municipios de Cd. Valles, Aquismón, Tamazunchale, Huehuetlan y Matlapa.
- Empleos directos: 9,595 Empleos indirectos: 38,382
