Avance del PEF 2023 Subsecretaría de Infraestructura

Corte al 18 de junio de 2023





PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Avance financiero (mdp)





Se cuenta con una inversión PEF 2023 modificada de 57,755.3 mdp y a la fecha se han ejercido 20,912.7 mdp, que representan un 36.2% del avance financiero global.



Así mismo, el calendario modificado acumulado de enero a junio es de **25,621.8 mdp**, que representan un **44.4%** del PEF 2023 modificado.



Se tiene un saldo pendiente de ejercer en junio de 4,709.1 mdp, que representan un 8.2% del PEF 2023 modificado.

15,333.1

9,600.6

10,775.7

Mar

9,602.8

3.591.8

3,594.3 –^{3,902.9}

Feb

1,012.4 901.9

Ene

901.8

28,571.8

Jun

20,912.7

22,452.9

May


19,111.8

19,924.1

15,219.6

17,055.4


Abr

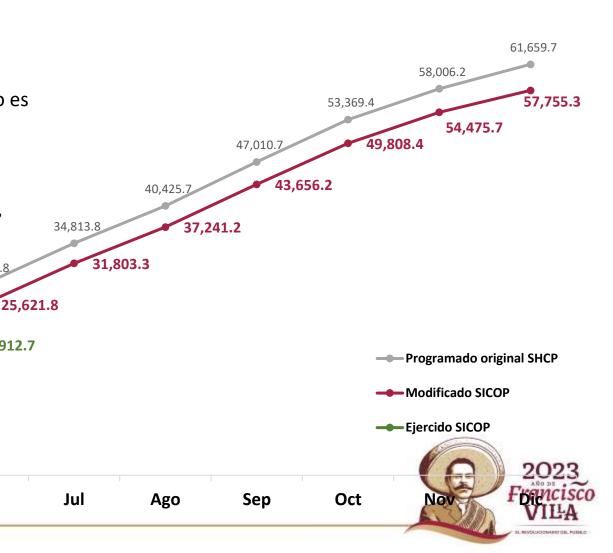

PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Escenario del avance del ejercicio de Junio 2023



Comportamiento de ejercicio en Junio 2023 de la SSI

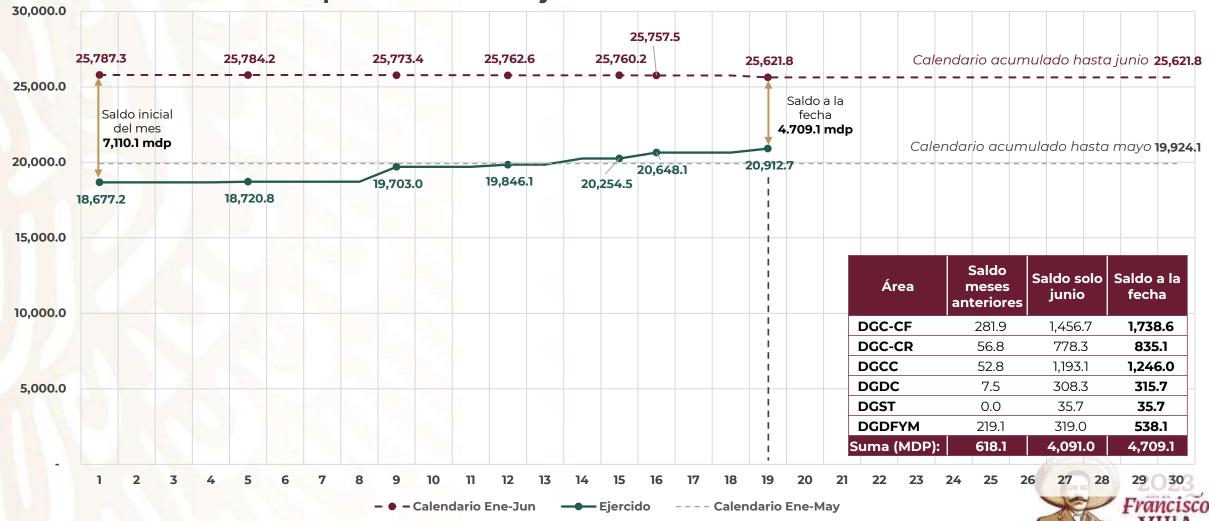

PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Corte del 18 de junio (mdp)



■ Ejercido SICOP

■ Saldo

PEF modificado 2023: 57,755.3 mdp

Ejercido en enero a junio : 20,912.7 mdp

Al mes de junio, se tiene un saldo acumulado pendiente de ejercer de 4,709.1 mdp de los 25,621.8 mdp programados acumulados.

> CF: 1,738.6 mdp


> CRyA: 835.1 mdp

> CC: 1,246.0 mdp

> DC: 315.7 mdp

> ST: 35.7 mdp

> FyM: 538.1 mdp

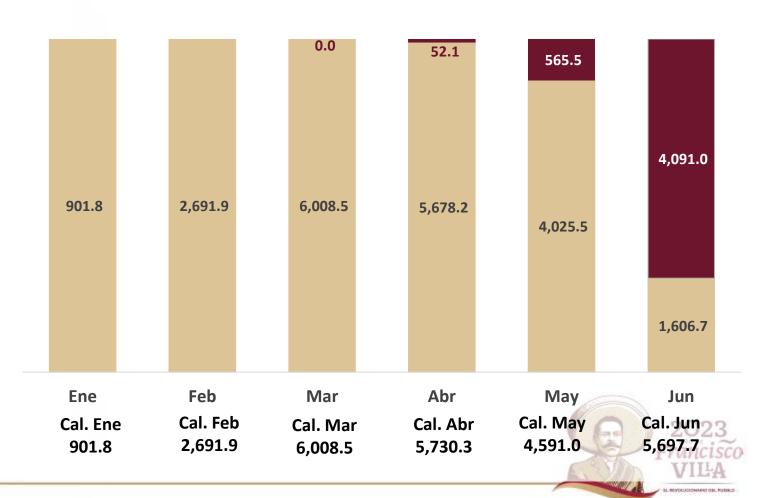

PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Corte 18 de junio (mdp)




Calendario modificado acumulado de enero a junio es de 25,621.8 mdp

Para el mes de **junio** se tiene el siguiente escenario general:

- Del calendario de enero y febrero se han ejercido en su totalidad los recursos.
- En marzo, se han ejercido **6,008.5 mdp**, y queda un saldo de **0.1 mdp**.
- En abril se han ejercido **5,678.2 mdp** y se tiene un saldo pendiente de **52.1 mdp**, de los cuales: **37.4 mdp** corresponden a la DGC, **11.0 mdp** a la DGCC, y **3.7 mdp** a la DGDFyM.
- En mayo se han ejercido **4,025.5 mdp** y se tiene un saldo de **565.5 mdp** de los cuales: **301.3 mdp** corresponden a la DGC, **41.9 mdp** a la DGCC, **7.5 mdp** a la DGDC, y **214.8 mdp** a la DGDFyM


Para junio, se tiene un saldo de **4,091.0 mdp**, y sumando el saldo pendiente de ejercer de enero a mayo, da un total de **4,709.1 mdp.**

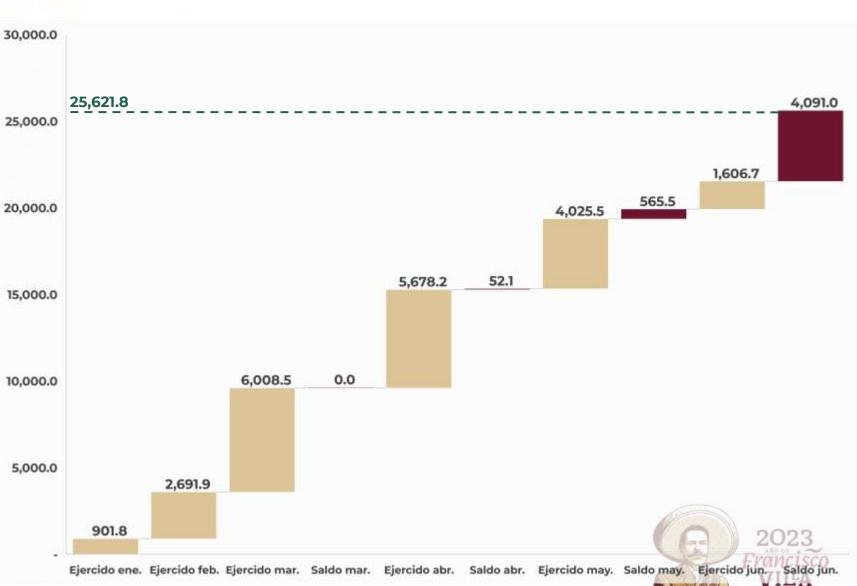

PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Avance financiero por Dirección General



	PEF 2023	PEF 2023		Acumulad	o a Junio		Augus	
Área	Original		Programado	Ejercido	Saldo del mes	Avance del mes	Avance global 2023	
Total SSI	61,659.7	57,755.3	25,621.8	20,912.7	4,709.1	81.6%	36.2%	
Subsector Carretero	49,785.3	51,923.2	22,577.2	18,406.2	4,171.0	81.5%	35.4%	
Carreteras Federales	18,150.2	18,097.3	8,194.1	6,455.5	1,738.6	78.8%	35.7%	
Caminos Rurales y Alimentadores	8,229.4	9,815.9	3,936.4	3,101.3	835.1	78.8%	31.6%	
Conservación de Carreteras	16,312.6	16,622.8	6,975.9	5,730.0	1,246.0	82.1%	34.5%	
Desarrollo Carretero	6,783.9	7,038.1	3,333.7	3,018.0	315.7	90.5%	42.9%	
Servicios Técnicos	309.2	349.2	137.0	101.3	35.7	74.0%	29.0%	
Subsector Ferroviario	11,874.4	5,832.0	3,044.6	2,506.5	538.1	82.3%	43.0%	
Ferroviario y Multimodal	11,874.4	5,832.0	3,044.6	2,506.5	538.1	82.3%	43.0%	

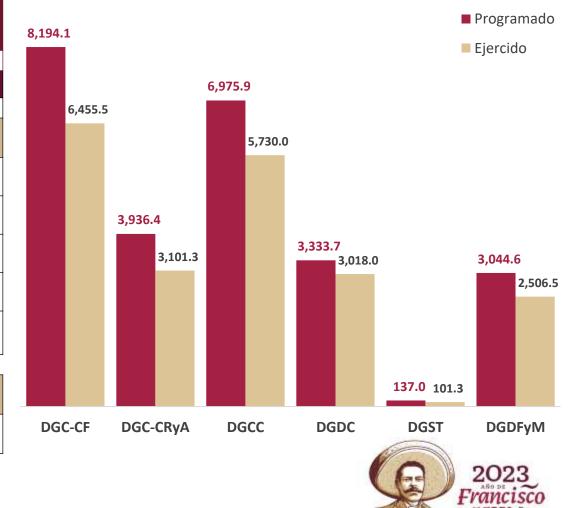

PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Reporte de Contratado vs Pendiente (mdp)





<i>£</i>	PEF 202	3 (SICOP)		En proceso	por
Area	Original	Modificado	Contratado	de licitación	licitar

Total SSI	61,659.7	57,755.3	50,395.8	3,692.5	3,666.9	
	- /	- /	/	- /	- /	

Subsector Carretero	49,785.3	51,923.2	45,948.5	2,816.6	3,158.1
Carreteras Federales	18,150.2	18,097.3	16,300.8	891.6	904.9
Caminos Rurales y Alimentadores	8,229.4	9,815.9	6,987.8	1,258.4	1,569.7
Conservación de Carreteras	16,312.6	16,622.8	15 <mark>,528.9</mark>	662.9	431.0
Desarrollo Carretero	6,783.9	7,038.1	6,792.0	-	246.0
Servicios Técnicos	309.2	349.2	339.0	3.7	6.5

Subsector Ferroviario	11,874.4	5,832.0	4,447.3	875.9	508.8
Ferroviario y Multimodal	11,874.4	5,832.0	<mark>4,44</mark> 7.3	875.9	508.8

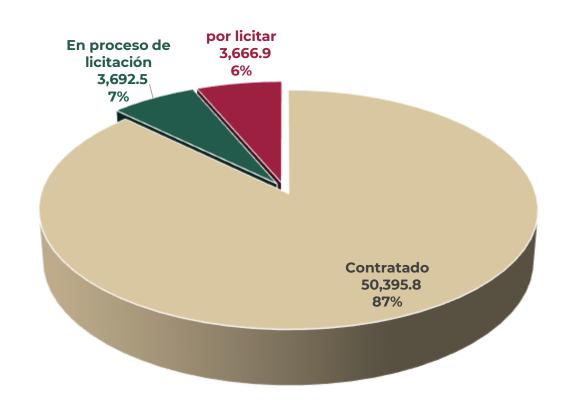




PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Reporte de Comprometido vs Disponible (mdp)



í	PEF 202	PEF 2023 (SICOP)		Contratado sin registrar	En proceso		
Área	Original	Modificado	total en SICOP	en sistema SICOP	de licitación	por licitar	
					I	1	
Total SSI	61,659.7	57,755.3	44,637.0	5,758.8	3,692.5	3,666.9	
Subsector Carretero	49,785.3	51,923.2	40,993.7	4,954.8	2,816.6	3,158.1	
Carreteras Federales	18,150.2	18,097.3	15,425.3	875.5	891.6	904.9	
Caminos Rurales y Alimentadores	8,229.4	9,815.9	4,469.8	2,517.9	1,258.4	1,569.7	
Conservación de Carreteras	16,312.6	16,622.8	13,987.9	1,541.0	662.9	431.0	
Desarrollo Carretero	6,783.9	7,038.1	6,785.1	6.9	-	246.0	
Servicios Técnicos	309.2	349.2	325.5	13.5	3.7	6.5	
Subsector Ferroviario	11,874.4	5,832.0	3,643.3	804.0	875.9	508.8	
Ferroviario y Multimodal	11,874.4	5,832.0	3,643.3	804.0	875.9	508.8	

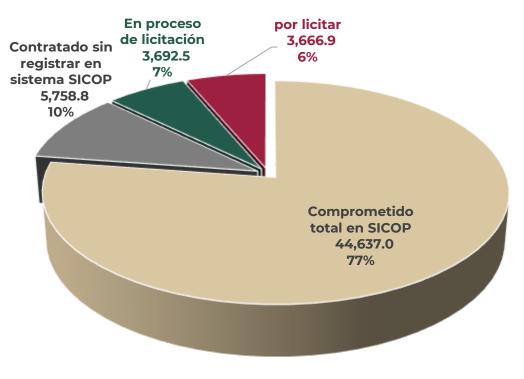



PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Recurso contratado sin registrar en sistema SICOP (mdp)



Área / Concepto	Monto (mdp)	Comentarios					
Suma:	5,758.8						
Carreteras Federales	875.5	K003 Construcción y modernización 706.8mdp K033 Estudios y proyectos 168.7mdp					
Caminos Rurales y Alimentadores	2,517.9	K031 Construcción y modernización 46.0 mdp K037 Conservación de infraestructura 333.0 mdp K039 Estudios y proyectos 106.0 mdp U004 Caminos de Manos de Obra 1,619.1 mdp Obra de emergencia 344.5 mdp Convenio FONATUR Tren Maya y SICT 69.3 mdp					
Conservación de Carreteras	1,541.0	K032 Reconstrucción y conservación 1,519.6 mdp G003 APP's 21.4 mdp					
Desarrollo Carretero	6.9	PPS Nuevo Necaxa - Avila Camacho					
Servicios Técnicos	13.5	K028 Estudios de preinversión					
Desarrollo Ferroviario y Multimodal	804.0	K041 Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA 804.0 mdp					

PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Recurso en proceso de licitación (mdp)



Área / Concepto	Monto (mdp)	Comentarios
Suma:	3,692.5	
Carreteras Federales	891.6	K003 Construcción y modernización 858.8 mdp K033 Estudios y proyectos 32.8 mdp
Caminos Rurales y Alimentadores	1,258.4	K031 Construcción y modernización 319.0 mdp K037 Conservación de infraestructura 771.4 mdp K039 Estudios y proyectos 138.9 mdp Convenio FONATUR Tren Maya y SICT 29.1 mdp
Conservación de Carreteras	662.9	K032 Reconstrucción y conservación 662.9 mdp
Servicios Técnicos	3.7	K028 Estudios de preinversión 3.7 mdp
Desarrollo Ferroviario y Multimodal	875.9	K040 Tren Interurbano México-Toluca 3.1 mdp K041 Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA y Sist Integrado de Trans. en la Zona Oriente del Valle de México 809.0 mdp K041 Sistema Integrado de Transporte en la Zona Oriente del Valle de México 63.8 mdp

PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Recurso por licitar (mdp)




Área / Concepto	Monto (mdp)	Comentarios					
Suma:	3,666.9						
Carreteras Federales	904.9	K003 Construcción y modernización 444.6 mdp K033 Estudios y proyectos 51.4 mdp K048 Liberación de derecho de vía 408.9 mdp					
Caminos Rurales y Alimentadores	1,569.7	K031 Construcción y modernización 42.7 mdp K037 Conservación de infraestructura 224.4 mdp K039 Estudios y proyectos 68.6 mdp U004 Caminos de Manos de Obra 346.4 mdp Obras de Emergencia 886.0 mdp Convenio FONATUR Tren Maya y SICT 1.6 mdp					
Conservación de Carreteras	431.0	K032 Reconstrucción y conservación 431.0 mdp					
Desarrollo Carretero	246.0	K048 Liberación de derecho de vía 246.0 mdp					
Servicios Técnicos	6.5	K028 Estudios de preinversión 6.5 mdp					
Desarrollo Ferroviario y Multimodal	508.8	K041 Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA y Sist Integrado de Trans. en la Zona Oriente del Valle de México 390.3 mdp K041 Sistema Integrado de Transporte en la Zona Oriente del Valle de México 118.5 mdp					

DGC – Carreteras Federales Avance financiero



	P.P.		PEF 2023	Acun	Avance		
Clave	Programa	PEF 2023 Original		Programado	Ejercido	Avance	global 2023
K003	Construcción y modernización	16,362.9	16,894.4	7,766.8	6,149.8	79.2%	36.4%
К033	Estudios y proyectos	500.0	500.0	122.4	58.3	47.7%	11.7%
K048	Liberación de derecho de vía	1,287.3	702.9	304.9	247.4	81.1%	35.2%
	Total		18,097.3	8,194.1	6,455.5	78.8%	35.7%

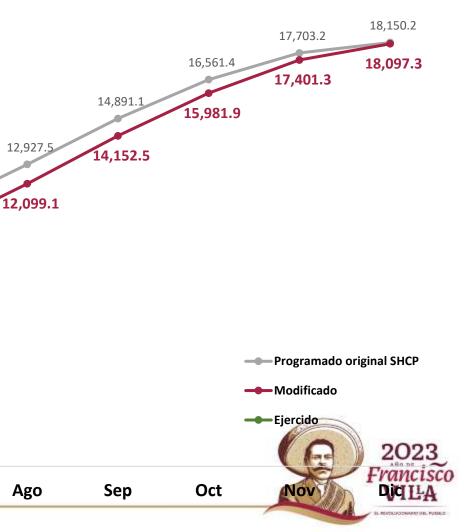

11,042.6

10,176.9

Jul

9,229.7

8,194.1

Jun

6,455.5

7,739.5

May

6,078.6

5,914.7 **6,360.4**

4,595.0

4,562.6

Abr

3,430.5 **2,960.1**

Mar

2,960.1

1,937.6

1,831.8

Feb

1,831.8

3.0


Ene


3.0

DGC – Carreteras Federales Avance físico-financiero de las Obras del Bienestar



	PEF 2023 (mdp)			Av. físico	Av. físico	
Obra	Modificado	Ejercido 11 de junio	Ejercido 18 de junio	global 30 abril (%)	global 31 mayo (%)	Avance financiero 2023 (%)
/ER . Ozuluama-Tampico	668	346	375	82.9%	85.3%	56.2%
SLP. Cd. Valles-Tamazunchale	3,142	1,307	1,385	41.1%	43.2%	44.3%
DAX/VER. Acayucan-La /entosa- Jaltipán	1,736	679	702	90.4%	91.3%	40.4%
GRO. Las Vigas-Lim. de Edos. Gro/Oax	2,704	989	995	10.7%	16.8%	37.1%
Total	8,250	3,320	3,457			Conc

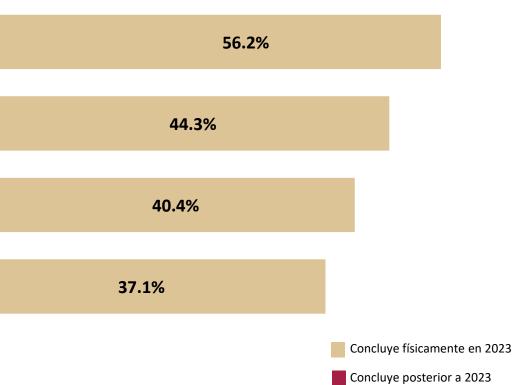




DGC – Caminos Rurales y Alimentadores Avance financiero



	P.P.		DEE 2022	Acu	Avance		
Clave	Programa	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Programado	Ejercido	Avance	global 2023
K031	Construcción y modernización	1,200.0	1,876.2	613.6	478.9	78.1%	25.5%
K037	Conservación	6,629.4	4,483.3	1,965.0	1,641.3	83.5%	36.6%
K039	Estudios y proyectos	400.0	440.0	90.9	32.7	36.0%	7.4%
U004	Caminos de mano de obra	_	3,016.4	1,266.9	948.3	74.9%	31.4%
	Total		9,815.9	3,936.4	3,101.3	78.8%	31.6%

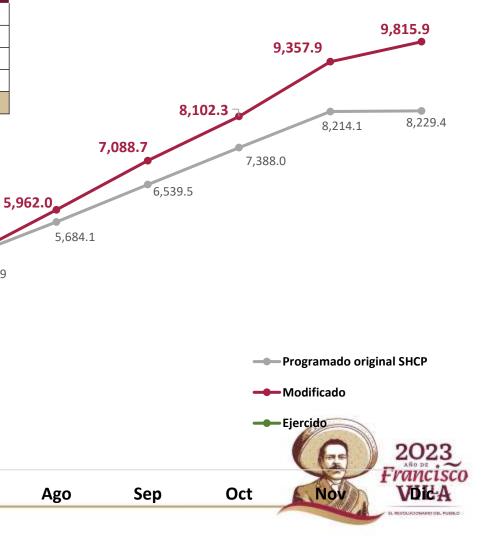

4,867.6

4,114.3

3,101.3

Jun

3,936.4

3,438.0

2,914.0

May

2,970.8

2,771.8

2,457.2

Abr

2,462.3

1,679.0

2,070.1

Mar

1,679.0

283.9

Ene

Feb

4,870.9

Jul

DGC – Caminos Rurales y Alimentadores Avance físico-financiero de las Obras del Bienestar



		Av. físico	Av. físico		
Obra	Modificado	Ejercido al 11 de Junio	Ejercido al 18 de Junio	global 30 abril (%)	global 31 mayo (%)
Tayoltita - Lim. Edos. Dgo/Sin – Vado Hondo – San Júan	1,200	275	293	15.0%	21.5%
Total=	1,200	275	293		

Avance financiero 2023 (%)

24.4%


Concluye físicamente en 2023

Concluye posterior a 2023



Dirección General de Conservación de Carreteras Avance financiero



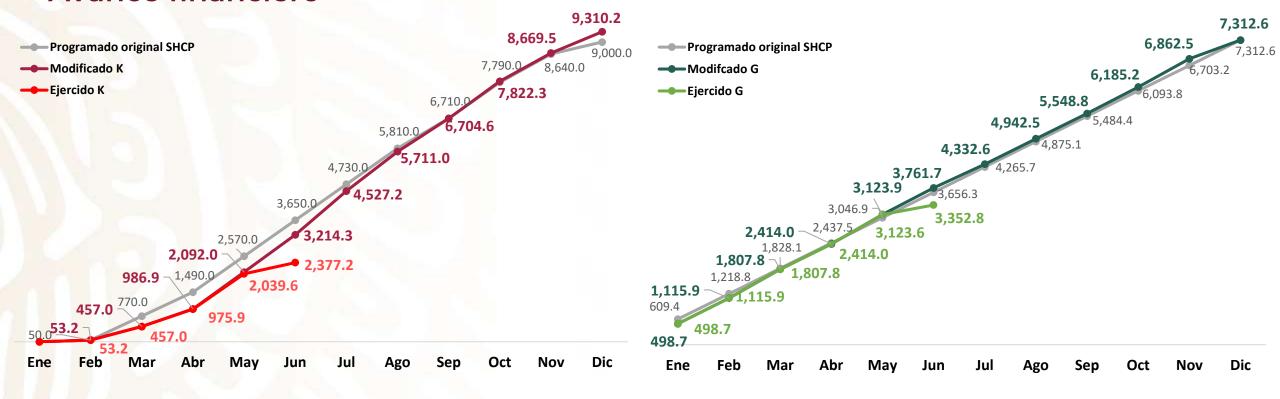


P.P.		DEE 2022 DEE 2022		Acum	Avance		
Clave	Programa	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Programado	Ejercido	Avance	global 2023
K032	Reconstrucción y Conservación	9,000.0	9,310.2	3,214.3	2,377.2	74.0%	25.5%
G003 APP's		7,312.6	7,312.6	3,761.7	3,352.8	89.1%	45.8%
Total		16,312.6	16,622.8	6,975.9	5,730.0	82.1%	34.5%




Dirección General de Desarrollo Carretero Avance financiero



P.P.		PEF 2023 PEF 2023		Acı	Avance		
Clave	Programa			Programado	Ejercido	Avance	global 2023
G003	PPS y APP	6,783.9	6,783.9	3,325.6	3,009.9	90.5%	44.4%
KN48	Liberación de derecho de vía	_	254.2	8.1	8.1	100.0%	3.2%
	Total	6,783.9	7,038.1	3,333.7	3,018.0	90.5%	42.9%




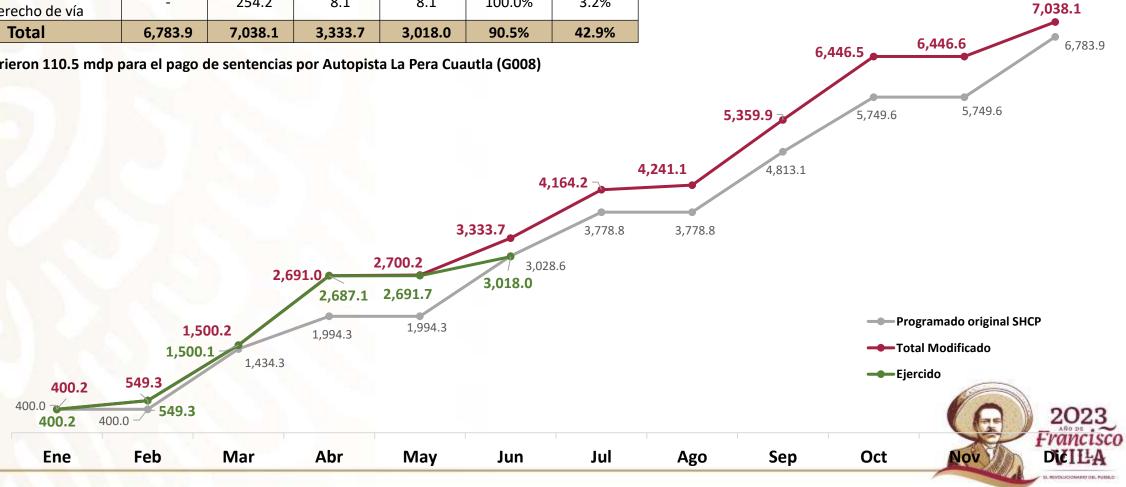

Dirección General de Servicios Técnicos Avance financiero





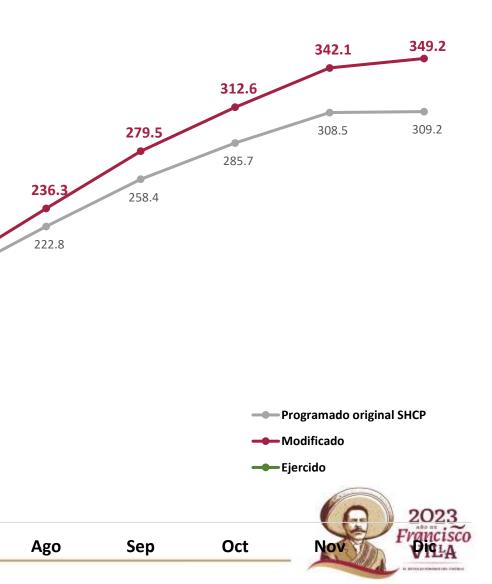

192.3

185.0

Jul

137.

101.3

Jun

97.0

75.4

75.2

May

66.5

42.1

Abr

48.8

13.8

Mar

1.9


Feb


Ene

Dirección General Desarrollo Ferroviario y Multimodal Avance financiero




	P.P.	PEF 2023	PEF 2023	Acumı	ılado a Ju	nio	Avance
Clave	Programa			Programado	Ejercido	Avance	global 2023
K040	Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros (Tren Interurbano México-Toluca)	7,000.0	957.6	957.3	954.4	99.7%	99.7%
K041	Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros (Trolebús Chalco- Sta Martha y Suburbano Lechería-AIFA)	4,874.4	4,874.4	2,087.3	1,552.1	74.4%	31.8%
	Total	11,874.4	5,832.0	3,044.6	2,506.5	82.3%	43.0%

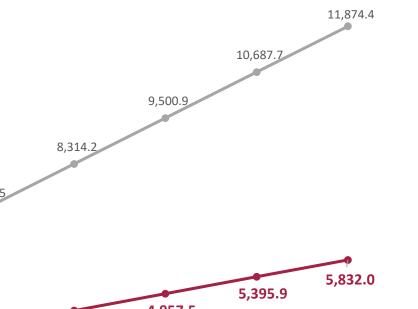

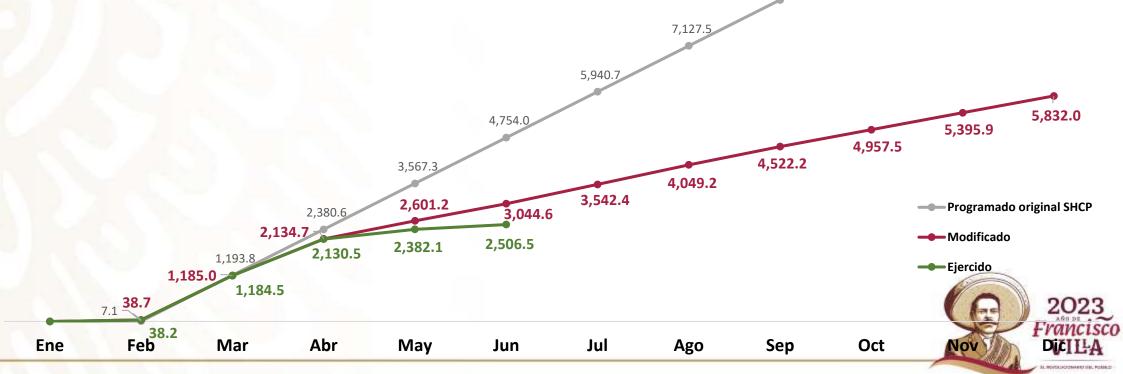

Atención a obras de Emergencias



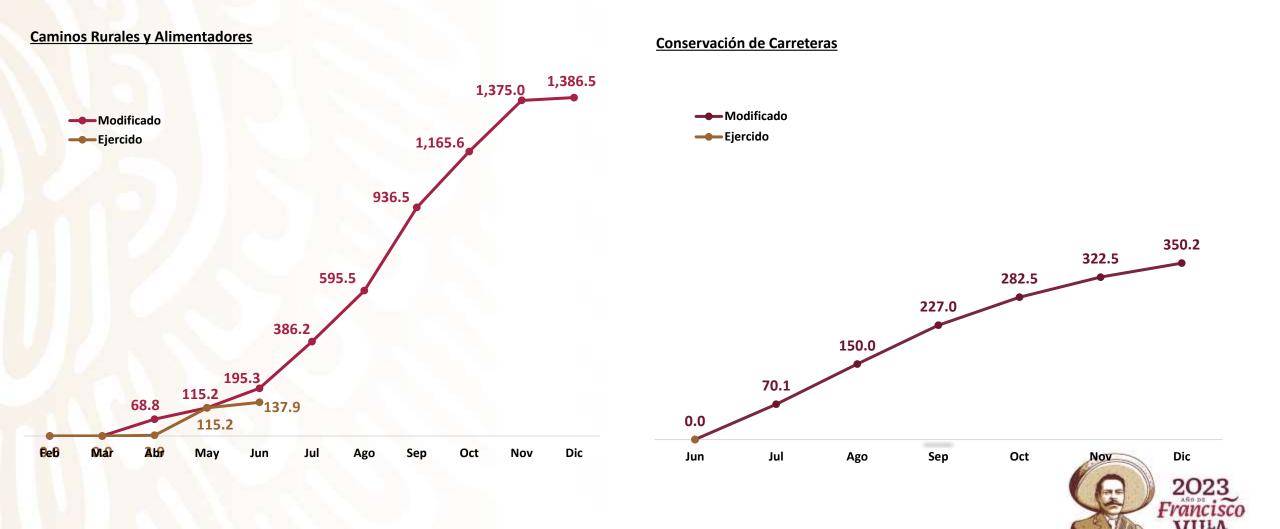

Atención a obras de Emergencias Caminos Rurales y Alimentadores 2023



Estado	Asignado	Contratado	Ejercido	Economías	Avance Financiero % *
	1,386.5	360.1	137.9	1,026.3	38.3%
Baja California Sur	65.6	0.0	0.0	65.6	0.0%
Campeche	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0%
Chiapas	154.5	2.9	2.9	151.6	100.0%
Durango	50.8	0.0	0.0	50.8	0.0%
Guanajuato	1.5	0.0	0.0	1.5	0.0%
Guerrero	91.3	0.0	0.0	91.3	0.0%
Hidalgo	102.8	0.0	0.0	102.8	0.0%
Jalisco	90.2	0.0	0.0	90.2	0.0%
Michoacán	66.3	0.0	0.0	66.3	0.0%
Nayarit	40.8	0.0	0.0	40.8	0.0%
Oaxaca	481.2	357.2	135.0	123.9	37.8%
Puebla	47.1	0.0	0.0	47.1	0.0%
Sinaloa	34.4	0.0	0.0	34.4	0.0%
Veracruz	99.7	0.0	0.0	99.7	0.0%
Yucatán	27.0	0.0	0.0	27.0	0.0%

^{* %} Corresponde al monto ejercido entre el monto contratado

Avance financiero global (38.3%)

100.0%

37.8%



Atención a obras de Emergencias Conservación de Carreteras 2023



Estado	Asignado	Contratado	Ejercido	Economías	Avance Financiero %*
	350.2	0.0	0.0	0.0	0.0%
Baj <mark>a California</mark>	50.1	0.0	0.0	0.0	0.0%
Baja California Sur	55.2	0.0	0.0	0.0	0.0%
Colima	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0%
Chiapas	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0%
Durango	71.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
Oaxaca	51.7	0.0	0.0	0.0	0.0%
Veracruz	59.8	0.0	0.0	0.0	0.0%
Yucatán	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0%

Avance financiero global (0.0%)



^{* %} Corresponde al monto ejercido entre el monto contratado

Subsecretaría de Infraestructura Licitaciones con PEF 2023





Del PEF 2023 (57,755.3 mdp), se licitó el 35.8% (20,671.4 mdp).



El 57.8% del PEF (33,416.9 mdp) corresponde a APP's, PPS's, cabeceras municipales, convenios de reasignación, plurianualidades, revalidaciones, adeudos, gastos de operación, etc.



El 6.3% (3,666.9 mdp) del PEF autorizado modificado, se tiene como recurso disponible o por licitar.

Licitación Pública Nacional

686 licitaciones 19,805.0 mdp 95.8%

Invitación a 3 personas

235 licitaciones 863.5 mdp 4.2%

922 licitaciones 20,671.4 mdp

Adjudicación Directa

1 licitaciones
3.0 mdp

0.0%

Licitaciones de obra 538 / 18,968.3 mdp

Adjudicadas: 457 / 16,210.1 mdp En proceso: 81 / 2,758.1 mdp Licitaciones de servicios 384 / 1,703.2 mdp


Adjudicadas: 257/1,257.6 mdp

En proceso: 127 / 445.5 mdp



PEF 2023 (corte al 15 de junio) % de avance ejercido por Centro SICT



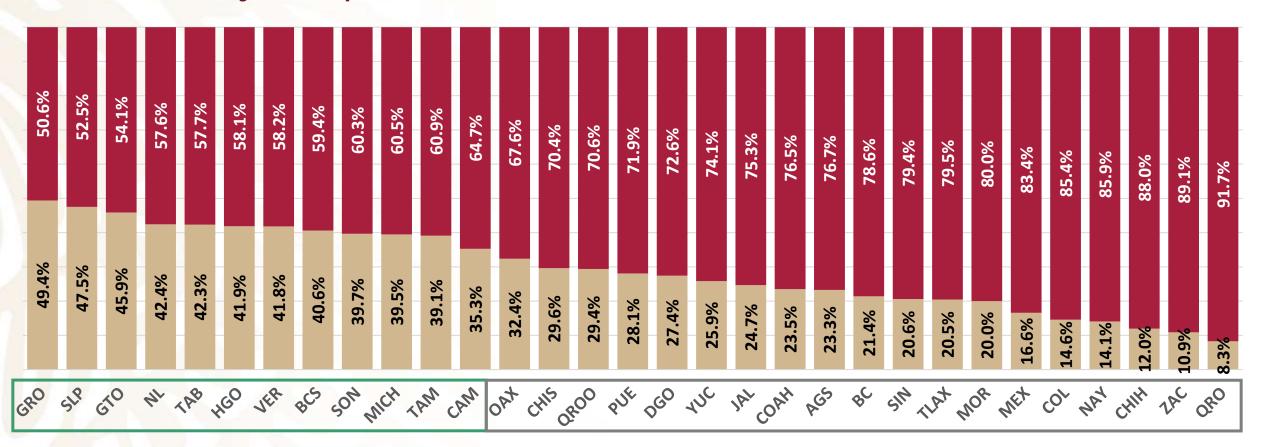



La inversión de los 31 CSICT es de 50,732.0 mdp, se ejercieron 17,891.1 mdp.



12 Centros SICT están por arriba del avance promedio (35.3%).



19 Centros SICT están por abajo del avance promedio.






PEF 2023 (corte al 15 de junio) % de avance ejercido por Programa Presupuestal





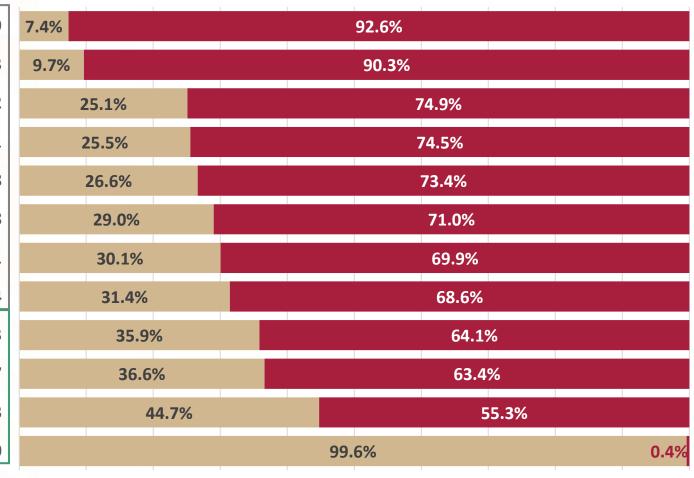



La inversión de los Programas Presupuestales es de 57,755.3 mdp, se ejercieron 20,628.2 mdp



4 Programas están por arriba del promedio (35.7%)



8 Programas están por abajo del promedio







Anexo: Reporte de Comprometido vs Disponible (mdp)





Subsecretaría de Infraestructura

Registro SHCP	Dirección General o Área	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por comprometer)	Observaciones
	TOTAL (MDP)	61,659.7	57,755.3	44,637.0	5,758.8	3,692.5	3,666.9	
Direc	ción General de Carreteras	26,379.6	27,913.2	19,895.2	3,393.4	2,150.0	2,474.6	
	Carreteras Federales	18,150.2	18,097.3	15,425.3	875.5	891.6	904.9	
	Caminos Rurales y Alimentadores	8,229.4	9,815.9	4,469.8	2,517.9	1,258.4	1,569.7	
Direc	ción General Conservación de Carreteras	16,312.6	16,622.8	13,987.9	1,541.0	662.9	431.0	
	Conservación de Carreteras Federales	9,000.0	9,310.2	6,696.7	1,519.6	662.9	431.0	
	Asociación Pública Prívada	7,312.6	7,312.6	7,291.2	21.4	-	-	
Direc	ción General de Desarrollo Carretero	6,783.9	7,038.1	6,785.1	6.9	-	246.0	
Direc	ción General de Servicios Técnicos	309.2	349.2	325.5	13.5	3.7	6.5	
Direc	ción General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal	11,874.4	5,832.0	3,643.3	804.0	875.9	508.8	





Dirección General de Carreteras Programa de Construcción y Modernización de Carreteras

Registro SHCP	Carretera	PEF 2023 MDP	Autorizado Modificado MDP	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por comprometer)	Observaciones
	TOTAL (MDP)	18,150.2	18,097.3	15,425.3	875.5	891.6	904.9	
BAJA CAL	BAJA CALIFORNIA		477.0	369.3	13.4	79.2	15.1	
20096220002	Carretera Transpeninsular, tramo del km 15+400 al km 21+600	477.0	397.0	369.1	13.4	0.0	14.5	12.8 mdp Economía y 1.7 mpd ajuste de costos
19096220001	Modernización de la carretera federal MEX-001 Ensenada - Lázaro Cárdenas, tramo: Punta Colonet - Lázaro Cárdenas	0.0	80.0	0.2	0.0	79.2	0.6	ajuste de costos
BAJA CAL	LIFORNIA SUR	329.0	329.0	323.7	5.3	-	-	
22096230002	Vizcaíno - Guerrero Negro	329.0	180.5	175.2	5.3	-	-	
	Vizcaíno - Guerrero Negro (Reasignación al Gob. Del Edo)	-	148.5	148.5	-			Convenio de reasignación
CHIAPAS		140.0	714.0	151.6	156.3	406.1		
11096270038	Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes	140.0	714.0	151.6	156.3	406.1	-	Apertura: 16-jun-2023 Se estima quede comprometido en la primera quincena de julio de 2023.
GUERRER	20	2,904.1	2,881.6	2,373.3	35.1	270.0	203.2	de Jano de 2025.
8096320020	Acapulco-Zihuatanejo	200.0	198.0	159.6	4.8	-	33.6	En revisión por las partes Se estima quede comprometido en junio de 2023.
22096320001	Modernización de la carretera federal Las Cruces-Pinotepa Nacional MEX-200, tramo: Las Vigas-Lím. de Edos. Gro./Oax.	2,704.1	2,683.6	2,213.7	30.3	270.0	169.6	Apertura: 01-jun-2023 Se estima quede comprometido en la primera quincena de julio de 2023.
HIDALGO		1,109.0	1,109.0	1,011.0	98.0		-	
12096330030	Construcción de la Carretera Real del Monte - Ent. Huasca	809.0	809.0	734.5	74.5			-
20096330001	Pachuca - Huejutla, tramo: Cerro Colorado - Zacualtipán	300.0	300.0	276.5	23.5			-
OAXACA		1,258.6	1,258.6	1,070.2	18.5		169.8	
5096400027	Acayucan - Ent. La Ventosa	1,258.6	1,258.6	1,070.2	18.5		169.8	En revisión del Proyecto por la DGC Costo previsto de trincheras 352 mdp Se estima quede comprometido en julio de 2023.
QUINTAN	A ROO	5,508.0	5,508.0	5,164.7	343.3	-	-	
22096430001	Puente Vehicular Nichupté	4,430.0	4,430.0	4,169.4	260.6	-		-
22096430002	Conexión entre Av. Huayacán - Carretera Federal MEX-307 Reforma Agraria - Puerto Juárez. Av. Chac Mool	177.8	177.8	176.1	1.7	-	-	-
22096430003	Rehabilitación de la Carr. MEX-307 Reforma Agraria - Puerto Juárez, Tr: Boulevard Colosio	736.6	736.6	668.1	68.5	-	-	-
22092100004	Entronque Aeropuerto Cancún	163.6	163.6	151.1	12.5	-	-	-
SAN LUIS	POTOSÍ	3,142.2	3,122.2	3,110.6			11.6	
17096440002	Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles	3,142.2	3,122.2	3,110.6	-	-	11.6	<u>. </u>
TABASCO		350.0	350.0	319.7	-		30.3	222 1 5
13096470001	Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr. Entr. Reforma-Villahermosa	350.0	350.0	319.7	-	-	30.3	22.9 mdp Economía 7.4mdp ajuste de costos
VERACRU	JZ	1,145.0	1,145.0	990.2	36.7	103.5	14.6	
11096500018	Ozuluama-Tampico	667.7	667.7	558.9	30.9	65.0	12.9	ajuste de costos
22096500001	Libramiento Sayula	477.3	477.3	431.3	5.8	38.5	1.6	ajuste de costos



Dirección General de Carreteras Programa de Construcción y Modernización de Carreteras

Registro SHCP	Carretera	PEF 2023 MDP	Autorizado Modificado MDP	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por comprometer)	Observaciones
Programa	de Estudios y Proyectos de Carreteras Federales	500.0	500.0	247.1	168.7	32.8	51.4	Se estima comprometer en su totalidad en el mes de junio
Programa	a de Derecho de Vía de Carreteras Federales	1,287.3	702.9	293.9			408.9	En proceso de Ejecución 203.6 mdp, por comprometer en oficinas centrales 99.5 mdp, transferencias en elaboración y en trámite 94.4 mdp



Dirección General de Carreteras Programa de Caminos Rurales y Alimentadores

Registro SHCP	Carretera	PEF 2023 MDP	Autorizado Modificado MDP	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
	TOTAL (MDP)	8,229.4	9,815.9	4,469.8	2,517.9	1,258.4	1,569.7	
DURANG	GO	605.0	466.3	315.0	12.7	95.8	42.8	
22096300001	Camino Tayoltita - Lim. Edos. Dgo/Sin	605.0	274.0	263.0	11.0	-	-	-
5096300002	Los Herrera - Tamazula.	-	52.3	51.7	0.6		-	
23096300001	Camino Durango - La Flor - San Bernardino de Milpillas Chico - San Francisco de Lajas. Tramo del Km. 112+400 al Km. 146+260	-	140.0	0.2	1.2	95.8	42.8	Próximo a publicarse el 29 de Junio
GUERRE		-	123.1	102.9	20.2	-		
22096320002	Construcción del Puente Vehicular y Accesos en el Km. 71+220 de la Carretera Tlapa - Marquelia	-	113.0	101.8	11.1		-	
10096320017	Ayutla-Acatepec,Tr: San José La Hacienda-Encino Amarillo	-	10.1	1.0	9.1		-	
NAYARIT		-	146.3	46.3		100.0		
22096380001	Camino Ramal a Huajimic.	-	100.0	-	-	100.0	-	En proceso de Licitación
19096380001	Camino Presa del Cajón - Carretones - Aserradero de las Palas - Guadalupe Ocotán	-	15.1	15.1	-		-	
20096380001	Eje Interestatal (Tepic - Aguascalientes), tramo: Carretones - Mesa de Pajaritos - Camotlán	-	31.2	31.2	-		-	
OAXACA			34.9	34.7	0.2			
16096400004	Modernización a nivel de Pavimento de la Carretera E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - Santiago Quiavicusas del km 0+000 al km 23+000	-	0.2	0.2	-		-	
21096400012	Camino Marinero - Malucano - Rio Potrero, Tramo Marinero - Malucano Subtramo del Km 1+180 al Km 4+760	-	0.6	0.6	-		-	
20096400002	Camino E.C. (Sn P Amuzgos - Cacahuatepec) - Sn Antonio Ocotlán Incluye Ramal a Sn Pedro Amuzgos y Sn Martín Amuzgos (Edo Oax) - Gpe Victoria (Edo Gro)	=	34.1	34.0	0.2		-	
PUEBLA			37.1			37.1		
23096410002	Construcción del Puente Vehicular "Los Ladrillos"	-	7.9	-	-	7.9	-	En proceso de Licitación
23096410001	Construcción del Puente Vehicular Juan Manuel Rodríguez Rodríguez	-	29.2	-	-	29.2	-	En proceso de Licitación
SINALOA	A.	595.0	926.7	916.7	10.0			
18096450004	San Juan - Vado Hondo	174.0	174.0	172.7	1.3		-	
22096450001	Camino Vado Hondo - Lim. Edos. Sin/Dgo.	421.0	752.0	743.3	8.7		-	
19096450002	Construcción de Camino Rural San Ignacio - Tayoltita	-	0.7	0.7	0.0		-	
SONARA			11.7	11.7				
14096460006	Agua Prieta - Bavispe	=	11.7	11.7	-		=	
TABASC	0		4.0	4.0				
20096470001	Puente Quintín Aráuz.	-	4.0	4.0	-		-	
VERACR	uz		126.3	37.4	2.8	86.0		
20096500002	Camino Minatitlan - Hidalgotitlán	-	97.1	8.6	2.5	86.0		En proceso de Licitación
20096500001	Camino Zontecomatlán - Xoxocapa - Ilamatlán	-	29.1	28.8	0.3			
Program	na de Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores	6,629.4	2,996.8	1,668.0	333.0	771.4	224.4	Recursos proximos a licitarse por parte de los Centros SICT a mas tardar el mes de junio





Dirección General de Carreteras Programa de Caminos Rurales y Alimentadores

Registro SHCP	Carretera	PEF 2023 MDP	Autorizado Modificado MDP	_	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
Programa Alimentad	de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y ores	400.0	440.0	126.5	106.0	138.9	68.6	Se tienen programados los fallos para el finales de junio Se estima licitar lo restante en el mes de junio
Programa	U0004 (Caminos Rurales y Alimentadores)		3,016.4	1,050.8	1,619.1		346.4	En proceso de formalización los convenios respectivos, se espera formalizarlos en el mes de junio
Obras de E	mergencia en Caminos Rurales y Alimentadores	-	1,386.5	155.9	344.5		886.0	Próximo a licitarse
Convenio I	ONATUR Tren Maya y SICT		100.0		69.3	29.1	1.6	Economias de licitaciones



Dirección General de Conservación de Carreteras Programa de Conservación de Carreteras (K032)

Montos por Comprometer por Cetro SICT y por Registro (PPI)

Registro SHCP	Entidad/Programa	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
	TOTAL (MDP)	9,000.0	9,310.2	6,696.7	1,519.6	662.9	431.0	
211	OFICINAS CENTRALES (UR 211)	9,000.0	368.8	254.1	71.3	4.4	39.0	
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de	9,000.0	368.8	254.1	71.3	4.4	39.0	Se espera convocar a prinicipios del próximo
621	Carreteras Libre de Peaje AGUASCALIENTES	· -	131.5	104.3	2.0	17.0	8.3	mes
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de		131.5	104.3	2.0	17.0	8.3	Sigue pendiente en espera definición de
622	Carreteras Libre de Peaje BAJA CALIFORNIA		339.3	191.2	68.0	30.0	50.1	proyecto
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje		289.2	191.2	68.0	30.0	-	
22092110006	Emergencias Kay 2022	-	50.1	-	-	-	50.1	Recursos de Emergencias recientemente autorizados
623	BAJA CALIFORNIA SUR		330.2	239.2	33.5	2.2	55.2	autorizados
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje	-	275.0	239.2	33.5	2.2		
22092110002	Emergencias OLAF 2021	-	27.0	-	-	-	27.0	Recursos de Emergencias recientemente autorizados
22092110005	Emergencias Javier 2022	-	28.2	-	-	-	28.2	Recursos de Emergencias recientemente autorizados
624	САМРЕСНЕ		188.9	178.5	3.6	6.8		
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje	-	188.9	178.5	3.6	6.8	-	
625	COAHUILA		335.6	267.1	26.0	42.5		
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje	-	335.6	267.1	26.0	42.5	-	
626	COLIMA	-	131.9	81.8	2.5	35.3	12.4	
21092110009	Emergencias Nora	-	12.4	-	-	-	12.4	Recursos de Emergencias recientemente autorizados
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje	-	119.6	81.8	2.5	35.3		
627	CHIAPAS		397.0	141.2	217.6	20.9	17.2	
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje	-	379.8	141.2	217.6	20.9	-	
22092110001	Emergencias Eventos 2020	-	17.2	-	-	-	17.2	Recursos de Emergencias recientemente autorizados
628	CHIHUAHUA		514.9	180.0	249.7	61.2	24.0	
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje	-	514.9	180.0	249.7	61.2	24.0	En espera de que nos envien Convocatoria
630	DURANGO		458.2	343.9	33.3	9.9	71.0	
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje	-	387.1	343.9	33.3	9.9	-	
22092110001	Emergencias Eventos 2020	-	71.0	-	-	-	71.0	Recursos de Emergencias recientemente autorizados
631	GUANAJUATO Discrepando Discrepando de Deservación de la Red Federal de		162.8	128.8	25.0	9.0		
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje	-	162.8	128.8	25.0	9.0	-	
632	GUERRERO		361.0	315.4	20.7	24.8		
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje	-	361.0	315.4	20.7	24.8	-	
633	HIDALGO		173.0	145.8	23.7	3.5		
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje	-	173.0	145.8	23.7	3.5	-	



Dirección General de Conservación de Carreteras Programa de Conservación de Carreteras (K032)

Montos por Comprometer por Cetro SICT y por Registro (PPI)

Registro SHCP	Entidad/Programa	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
634	JALISCO		451.5	392.5	58.9	_	_	
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje	-	451.5	392.5	58.9		-	
635	ESTADO DE MÉXICO		249.5	232.3	11.9	5.3	-	
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de	_	249.5	232.3	11.9	5.3	_	
	Carreteras Libre de Peaje MICHOACÁN							
636	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de	_	459.5	390.9	48.1	20.6	-	
21092110011	Carreteras Libre de Peaje	-	459.5	390.9	48.1	20.6	-	
637	MORELOS		101.9	84.0	10.1	7.8		
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje	-	101.9	84.0	10.1	7.8	-	
638	NAYARIT		166.1	149.7	6.8	9.6		
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje	-	166.1	149.7	6.8	9.6	-	
639	NUEVO LEÓN		219.9	197.8	12.4	9.7		
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de	_	219.9	197.8	12.4	9.7	_	
	Carreteras Libre de Peaje							
21092110011	OAXACA Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de		570.4 518.7	300.3 300.3	173.0 173.0	45.4 45.4	51.7 -	
22092110001	Carreteras Libre de Peaje Emergencias Eventos 2020	-	18.5	-	-	-	18.5	Recursos de Emergencias recientemente autorizados
22092110003	Emergencias Agatha 2022	-	33.1	-	-	-	33.1	Recursos de Emergencias recientemente autorizados
641	PUEBLA		197.0	173.3	13.1	10.6		autorizados
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje	-	197.0	173.3	13.1	10.6	-	
642	QUERÉTARO		162.6	127.7	17.4	17.4		
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje	-	162.6	127.7	17.4	17.4	-	
643	QUINTANA ROO		123.0	95.6	25.1	2.3		
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje	-	123.0	95.6	25.1	2.3	-	
644	SAN LUIS POTOSÍ		256.5	206.6	16.7	33.1		
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje	-	256.5	206.6	16.7	33.1	-	
645	SINALOA		259.2	204.6	33.3	21.3	-	
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje	-	259.2	204.6	33.3	21.3	-	
646	SONORA		313.3	267.0	42.0	4.4		
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje	-	313.3	267.0	42.0	4.4	-	
647	TABASCO		170.6	137.5	15.7	17.4	_	
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje	-	170.6	137.5	15.7	17.4	-	
648	TAMAULIPAS		330.7	281.6	12.3	36.8		
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje	-	330.7	281.6	12.3	36.8	-	
649	TLAXCALA	-	140.4	120.1	5.8	14.5	-	
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje	-	140.4	120.1	5.8	14.5	-	



Dirección General de Conservación de Carreteras Programa de Conservación de Carreteras (K032)

Montos por Comprometer por Cetro SICT y por Registro (PPI)

Registro SHCP	Entidad/Programa	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
650	VERACRUZ		624,5	304.6	168.1	92.0	59.8	
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje		564.7	304.6	168.1	92.0	-	
22092110008	Lluvias severas septiembre de 2022	-	59.8	-	-	-	59.8	Recursos de Emergencias recientemente autorizados
651	YUCATÁN		252.9	198.7		21.3	32.9	
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje	-	220.0	198.7	-	21.3		
22092110001	Emergencias Eventos 2020	-	32.9	-			32.9	Recursos de Emergencias recientemente autorizados
652	ZACATECAS		367.5	260.3	71.8	26.0	9.4	
21092110011	Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje	-	367.5	260.3	71.8	26.0	9.4	En espera de que nos envien Convocatoria



Dirección General de Desarrollo Carretero Programa Presupuestal G003 y K048

Registro SHCP	Obra o Proyecto	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
	TOTAL (MDP)	6,783.9	7,038.1	6,785.1	6.9	-	246.0	
G003	PROYECTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	6,648.2	6,648.2	6,641.3	6.9			
CHS	Tapachula-Talisman	409.5	409.5	409.5	-	-	-	
GTO	Irapuato-La Piedad	411.7	411.7	411.7	-	-	-	
GTO	Querétaro-Irapuato	-	1,399.4	1,399.4	-	-	-	
MICH	Nueva Italia Nueva Italia - Apatzingán	203.6	203.6	203.6	-	-	-	
OAX	Autopista Mitla-Tehuantepec	2,646.7	2,646.7	2,646.7	-	-	-	
PUE	Nuevo Necaxa - Avila Camacho	888.7	888.7	881.8	6.9	-	-	
QRO	Querétaro-Irapuato	1,399.4	-	-	-	-	-	
SLP	Rio Verde-Ciudad Valles	688.5	688.5	688.5	-	-	-	
G003	3 ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA	135.7	135.7	135.7	-	-	-	
PUE	APP Libramiento de la carretera La Galarza-Amatitlanes	135.7	135.7	135.7	-	-	-	
K048	B LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA		254.2	8.1			246.0	
22092140001	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	-	1.2	1.1	-	-	0.1	Recursos que se ejercerar de manera periodica conforme al pago del mismo.
22092140001	Servicios bancarios y financieros	-	7.5	7.0	-	-	0.5	Recursos que se ejercerar de manera periodica conforme al pago del mismo.
22092140001	Otros impuestos y derechos	-	0.0	0.0	-	-	-	
22092140001	Servicios para la liberacion de derechos de via	-	245.5	-	-	-	245.5	70.45 MDP se tienen pendientes de tramitar para ser transferidos al K033 y 175.06 MDP se tienen pendientes para otros pagos que no se han definido.



Dirección General de Servicios Técnicos Programa Presupuestal K028

Montos por Comprometer

Registro SHCP	Obra o Proyecto	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
	TOTAL (MDP)	309.2	349.2	325.5	13.5	3.7	6.5	
K028 ES	TUDIOS DE PREINVERSIÓN	309.2	349.2	325.5	13.5	3.7	6.5	
22092120001	Evaluación de los elementos funcionales, estructurales y de seguridad vial de la Red Carretera Federal (RCF) en 2023, a través de su auscultación	94.5	134.5	117.3	13.5	3.7	-	
22092120002	Actualización de normas, manuales técnicos y Tabuladores de Precios Unitarios y de Costos Paramétricos 2023.	39.3	39.3	35.6	-	-	3.7	Para los recurso por licitar, se tiene programada la publicacion de la convocatoria el 20 de junio de 2023
22092120003	Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la RCF en 2023	67.9	67.9	65.7	-	-	2.2	Para los recurso por licitar, se tiene programada la publicacion de la convocatoria el 20 de junio de 2023
22092120004	Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera a cargo de la SICT, en el año 2023	107.6	107.6	107.0	-	-	0.6	



Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal Programa Presupuestal K040 y K041 Montos por Comprometer en obras (Cifras SICOP)

Registro SHCP	Obra o Proyecto	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
	TOTAL (MDP)	11,874.4	5,832.0	3,643.3	804.0	875.9	508.8	
TREN	INTERURBANO MEXICO TOLUCA	7,000.0	957.6	954.5		3.1		
13093110008	Tren Interurbano Mexico Toluca SICT	7,000.0	7.6	4.5	-	3.1	-	Los recursos del proyecto se consideran para el pago de servicios de energía eléctrica de las estaciones.
13093110008	Convenio de Reasignación CDMX	-	950.0	950.0	-	-	-	
SUBL	IRBANO RAMAL LECHERIA AIFA	1,250.0	2,650.0	646.7	804.0	809.0	390.3	
20093110004	Liberacion De Derecho De Via	-	298.0	297.8	-	0.3	-	En el proyecto del Tren Suburbano AIFA, se tienen recursos comprometidos en SICOP por 649.6 mdp, asimismo, se cuenta con recursos contratados por 801.1 mdp, que por movimientos presupuestales no han sido capturados en SICOP, de los cuales 473.22 mdp corresponden a los contratos del 2023 y 327.9 mdp a
20093110004	Obras Civiles y Servicios (Supervisión, Estudios y Proyectos)	1,250.0	2,141.9	348.9	804.0	598.6	390.3	pagos de contratos plurianuales. En proceso de licitación se consideran 809.0 mdp para la construcción de 4 pasos vehiculares , trabajos de reubicación y reconfiguración del acueducto los Reyes Ecatepec, adquisición de
20093110004	Material De Via	-	210.1	-	-	210.1	-	materiales y Liberación del Derecho de Vía Los fallos y las firmas de los contratos se tiene estimado hacerlas entre el 16 de junio y el 30 de junio de 2023. Se cuenta con 390.3 mdp, programados para licitar en el mes de
SIT C	HALCO SANTA MARTHA	3,624.4	2,224.4	2,042.1		63.8	118.5	
21093110007	Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal	3,624.4	118.5	-	-	-	118.5	118.5 mdp son economías.
21093110007	Centro SICT Estado de México	-	1,400.0	1,336.2	-	63.8	-	Recursos a cargo del Centro SICT del Estado de México, de los cuales 63.8 mdp en proceso de Licitación
21093110007	Convenio de Reasignación CDMX	-	705.9	705.9	-	-	-	705.9 mdp fueron reasignados la Gobierno de la Ciudad de México para la ejecución del proyecto.








Contratado vs Pendiente y Comprometido vs Disponible

Contratado vs Pendiente

Área	PEF 202	3 (SICOP)	Contratado	En proceso de	por licitar	
Aled	Original Modificado		Contratado	licitación	por li citar	
Total SSI	C1 C50 F	50.055.7	50.705.0	7.602.5	7.666.0	
l otal SSI	61,659.7	57,755.3	50,395.8	3,692.5	3,666.9	
Subsector Carretero	49,785.3	51,923.2	45,948.5	2,816.6	3,158.1	
Carreteras Federales	18,150.2	18,097.3	16,300.8	891.6	904.9	
Caminos Rurales y Alimentadores	8,229.4	9,815.9	6,987.8	1,258.4	1,569.7	
Conservación de Carreteras	16,312.6	16,622.8	15,528.9	662.9	431.0	
Desarrollo Carretero	6,783.9	7,038.1	6,792.0	-	246.0	
Servicios Técnicos	309.2	349.2	339.0	3.7	6.5	
		:	•			
Subsector Ferroviario	11,874.4	5,832.0	4,447.3	875.9	508.8	
Ferroviario y Multimodal	11,874.4	5,832.0	4,447.3	875.9	508.8	



Comprometido vs Disponible

Área	PEF 202	3 (SICOP)	Comprometido	Contratado sin	En proceso de	may liaitay
Aled	Original	Modificado	total en SICOP	registrar en	licitación	por licitar
Total SSI	61,659.7	57,755.3	44,637.0	5,758.8	3,692.5	3,666.9
Subsector Carretero	49,785.3	51,923.2	40,993.7	4,954.8	2,816.6	3,158.1
Carreteras Federales	18,150.2	18,097.3	15,425.3	875.5	891.6	904.9
Caminos Rurales y Alimentadores	8,229.4	9,815.9	4,469.8	2,517.9	1,258.4	1,569.7
Conservación de Carreteras	16,312.6	16,622.8	13,987.9	1,541.0	662.9	431.0
Desarrollo Carretero	6,783.9	7,038.1	6,785.1	6.9	-	246.0
Servicios Técnicos	309.2	349.2	325.5	13.5	3.7	6.5
Subsector Ferroviario	11,874.4	5,832.0	3,643.3	804.0	875.9	508.8
Ferroviario y Multimodal	11,874.4	5,832.0	3,643.3	804.0	875.9	508.8

