Avance del PEF 2023 Subsecretaría de Infraestructura

Corte al 11 de junio de 2023





PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Avance financiero (mdp)






Se cuenta con una inversión PEF 2023 modificada de 57,865.7 mdp y a la fecha se han ejercido 19,846.1 mdp, que representan un 34.3% del avance financiero global.



Así mismo, el calendario modificado acumulado de enero a junio es de **25,762.6 mdp**, que representan un **44.5%** del PEF 2023 modificado.



Se tiene un saldo pendiente de ejercer en junio de **5,916.5 mdp**, que representan un **10.2%** del PEF 2023 modificado.

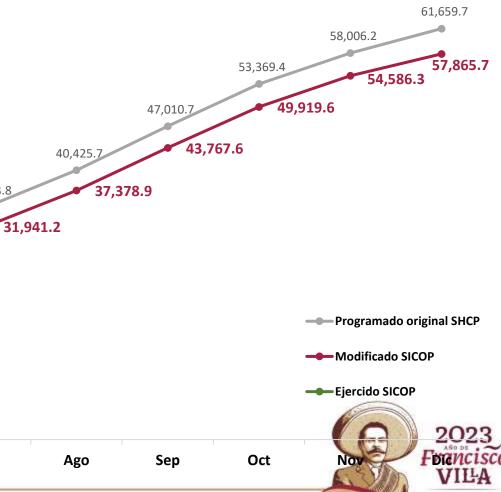



34,813.8

PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Corte del 11 de junio (mdp)



PEF modificado 2023: 57,586.7 mdp

- Ejercido en enero a junio : 19,846.1 mdp
- Al mes de junio, se tiene un saldo acumulado pendiente de ejercer de 5,916.5 mdp de los 25,762.6 mdp programados acumulados.

> CF: 2,050.5 mdp


> CRyA: 1,089.9 mdp

> CC: 1,584.9 mdp

> DC: 469.9 mdp

> ST: 60.0 mdp

> FyM: 661.3 mdp

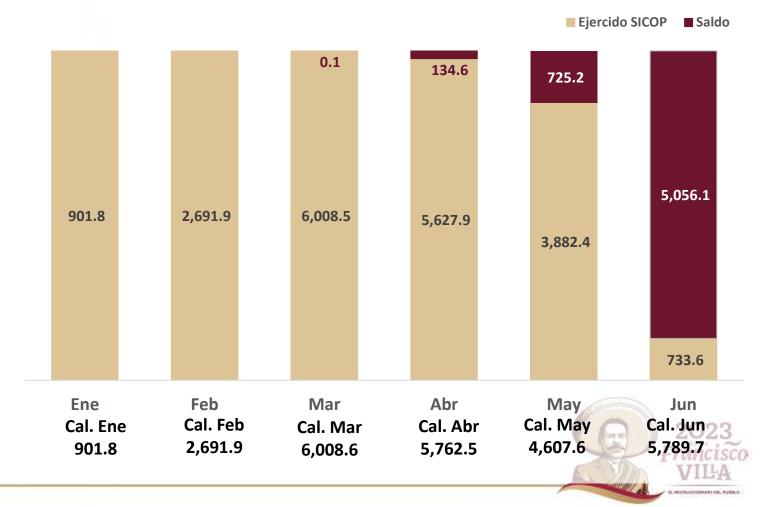

PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Corte 11 de junio (mdp)




Calendario modificado acumulado de enero a junio es de 25,762.6 mdp

Para el mes de **junio** se tiene el siguiente escenario general:

- Del calendario de enero y febrero se han ejercido en su totalidad los recursos.
- En marzo, se han ejercido **6,008.5 mdp**, y queda un saldo de **0.1 mdp**.
- En abril se han ejercido **5,627.9 mdp** y se tiene un saldo pendiente de **134.6 mdp**, de los cuales: **65.8 mdp** corresponden a la DGC, **15.0 mdp** a la DGCC, **0.9 mdp** a la DGDC y **52.9 mdp** a la DGDFyM.
- En mayo se han ejercido **3,882.4 mdp** y se tiene un saldo de **725.2 mdp** de los cuales: **381.4 mdp** corresponden a la DGC, **53.1 mdp** a la DGCC, **7.5 mdp** a la DGDC, y **283.2 mdp** a la DGDFyM

Para junio, se tiene un saldo de **5,056.1 mdp**, y sumando el saldo pendiente de ejercer de enero a mayo, da un total de **5,916.5 mdp.**

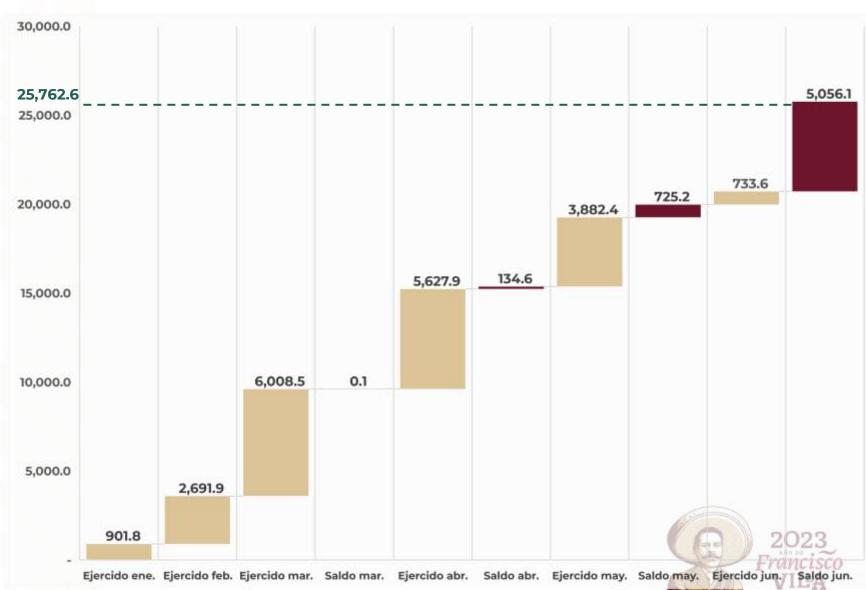


PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Avance financiero por Dirección General



Francisco

	PEF 2023	PEF 2023		Acumulad	o a Junio		Avence
Área	Original		Programado	Ejercido	Saldo del mes	Avance del mes	Avance global 2023
Total SSI	61,659.7	57,865.7	25,762.6	19,846.1	5,916.5	77.0%	34.3%
Subsector Carretero	49,785.3	52,033.7	22,715.4	17,460.3	5,255.2	76.9%	33.6%
Carreteras Federales	18,150.2	18,097.3	8,282.4	6,231.9	2,050.5	75.2%	34.4%
Caminos Rurales y Alimentadores	8,229.4	9,815.9	3,974.2	2,884.4	1,089.9	72.6%	29.4%
Conservación de Carreteras	16,312.6	16,622.8	6,982.2	5,397.4	1,584.9	77.3%	32.5%
Desarrollo Carretero	6,783.9	7,148.5	3,334.2	2,864.2	469.9	85.9%	40.1%
Servicios Técnicos	309.2	349.2	142.4	82.4	60.0	57.9%	23.6%
1							
Subsector Ferroviario	11,874.4	5,832.0	3,047.1	2,385.8	661.3	78.3%	40.9%
Ferroviario y Multimodal	11,874.4	5,832.0	3,047.1	2,385.8	661.3	78.3%	40.9%

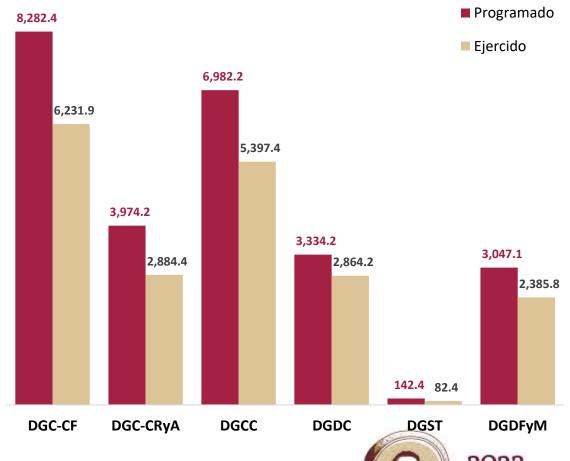

PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Reporte de Contratado vs Pendiente (mdp)




<i>t</i>	PEF 202	3 (SICOP)		En proceso	por
Area	Original	Modificado	Contratado	de licitación	licitar

Total SSI	61,659.7	57,865.7	49,791.2	4,174.1	3,900.4
-----------	----------	----------	----------	---------	---------

Subsector Carretero	49,785.3	52,033.7	45,460.1	3,182.0	3,391.6
Carreteras Federales	18,150.2	18,097.3	16,284.5	891.6	921.2
Caminos Rurales y Alimentadores	8,229.4	9,815.9	6,944.7	1,196.3	1,674.9
Conservación de Carreteras	16,312.6	16,622.8	15,101.4	1,090.3	431.0
Desarrollo Carretero	6,783.9	7,148.5	6,792.2	-	356.4
Servicios Técnicos	309.2	349.2	337.3	3.7	8.2

Subsector Ferroviario	11,874.4	5,832.0	4,331.1	992.1	508.8
Ferroviario y Multimodal	11,874.4	5,832.0	4,33 1.1	992.1	508.8

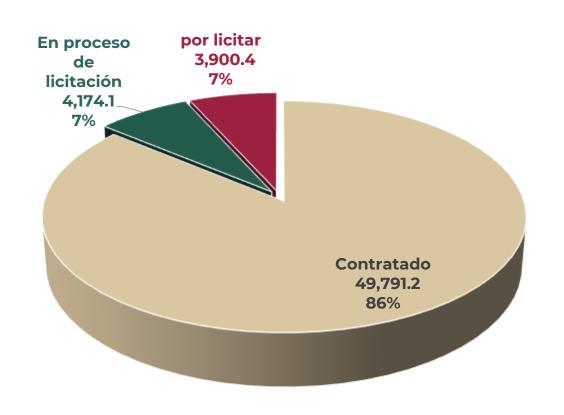




PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Reporte de Comprometido vs Disponible (mdp)



£	PEF 202	3 (SICOP)	Comprometido	Contratado sin registrar	En proceso		
Área	Original Modificad		total en SICOP	en sistema SICOP	de licitación	por licitar	
Total SSI	61,659.7	57,865.7	44,160.2	5,631.0	4,174.1	3,900.4	
Subsector Carretero	49,785.3	52,033.7	40,630.1	4,830.0	3,182.0	3,391.6	
Carreteras Federales	18,150.2	18,097.3	15,477.2	807.3	891.6	921.2	
Caminos Rurales y Alimentadores	8,229.4	9,815.9	4,545.3	2,399.4	1,196.3	1,674.9	
Conservación de Carreteras	16,312.6	16,622.8	13,527.1	1,574.3	1,090.3	431.0	
Desarrollo Carretero	6,783.9	7,148.5	6,785.3	6.9	-	356.4	
Servicios Técnicos	309.2	349.2	295.2	42.1	3.7	8.2	

Subsector Ferroviario	11,874.4	5,832.0	3,530.1	801.0	992.1	508.8
Ferroviario y Multimodal	11,874.4	5,832.0	3,530.1	801.0	992.1	508.8

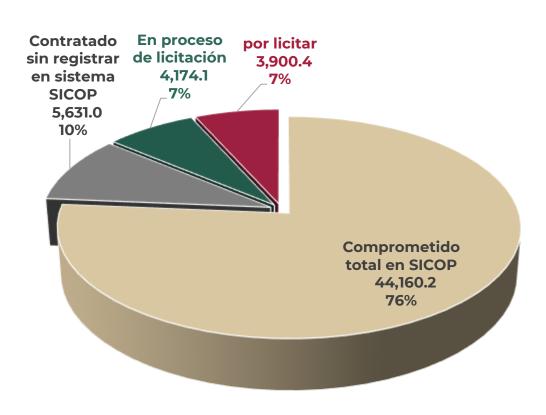



PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Recurso contratado sin registrar en sistema SICOP (mdp)



Área / Concepto	Monto (mdp)	Comentarios
Suma:	5,631.0	
Carreteras Federales	807.3	K003 Construcción y modernización 642.5 mdp K033 Estudios y proyectos 164.8mdp
		K031 Construcción y modernización 51.6 mdp
Caminos Rurales y Alimentadores	2,399.4	K037 Conservación de infraestructura 362.2 mdp K039 Estudios y proyectos 73.5 mdp U004 Caminos de Manos de Obra 1,566.5 mdp Obra de emergencia 293.4 mdp Convenio FONATUR Tren Maya y SICT 52.2 mdp
Conservación de Carreteras	1,574.3	K032 Reconstrucción y conservación 1,529.9 mdp G003 APP's 44.5 mdp
Desarrollo Carretero	6.9	PPS Nuevo Necaxa - Avila Camacho
Servicios Técnicos	42.1	K028 Estudios de preinversión
Desarrollo Ferroviario y Multimodal	801.0	K041 Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA 801.0 mdp

PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Recurso en proceso de licitación (mdp)



Área / Concepto	Monto (mdp)	Comentarios
Suma:	4,174.1	
Carreteras Federales	891.6	K003 Construcción y modernización 858.8 mdp K033 Estudios y proyectos 32.8 mdp
Caminos Rurales y Alimentadores	1,196.3	K031 Construcción y modernización 318.8 mdp K037 Conservación de infraestructura 705.1 mdp K039 Estudios y proyectos 125.7 mdp Convenio FONATUR Tren Maya y SICT 46.7 mdp
Conservación de Carreteras	1,090.3	K032 Reconstrucción y conservación 1,090.3 mdp
Servicios Técnicos	3.7	K028 Estudios de preinversión 3.7 mdp
Desarrollo Ferroviario y Multimodal	992.1	K040 Tren Interurbano México-Toluca 3.9 mdp K041 Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA y Sist Integrado de Trans. en la Zona Oriente del Valle de México 924.4 mdp K041 Sistema Integrado de Transporte en la Zona Oriente del Valle de México 63.8 mdp

PEF 2023 de la Subsecretaría de Infraestructura Recurso por licitar (mdp)




Área / Concepto	Monto (mdp)	Comentarios				
Suma:	3,900.4					
Carreteras Federales	921.2	K003 Construcción y modernización 467.3. mdp K033 Estudios y proyectos 56.4 mdp K048 Liberación de derecho de vía 397.5 mdp				
Caminos Rurales y Alimentadores	1,674.9	K031 Construcción y modernización 42.8 mdp K037 Conservación de infraestructura 224.4 mdp K039 Estudios y proyectos 107.8 mdp U004 Caminos de Manos de Obra 346.4 mdp Obras de Emergencia 952.4 mdp Convenio FONATUR Tren Maya y SICT 1.1 mdp				
Conservación de Carreteras	431.0	K032 Reconstrucción y conservación 431.0 mdp				
Desarrollo Carretero	356.4	K048 Liberación de derecho de vía 356.4 mdp				
Servicios Técnicos	8.2	K028 Estudios de preinversión 8.2 mdp				
Desarrollo Ferroviario y Multimodal	508.8	K041 Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA y Sist Integrado de Trans. en la Zona Oriente del Valle de México 390.3 mdp K041 Sistema Integrado de Transporte en la Zona Oriente del Valle de México 118.5 mdp				

DGC – Carreteras Federales Avance financiero



	P.P.		DEE 2022	Acum	Avance		
Clave	Programa	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Programado	Ejercido	Avance	global 2023
K003	Construcción y modernización	16,362.9	16,914.9	7,840.2	5,967.0	76.1%	35.3%
К033	Estudios y proyectos	500.0	500.0	136.0	46.2	34.0%	9.2%
K048	Liberación de derecho de vía	1,287.3	682.4	306.2	218.7	71.4%	32.1%
	Total		18,097.3	8,282.4	6,231.9	75.2%	34.4%

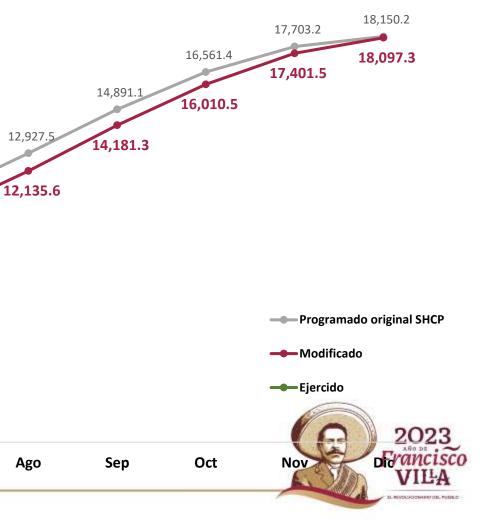

11,042.6

10,272.3

Jul

9,229.7

8,282.4

Jun

6,231.9

7,739.5

May

6,049.2

5,914.7 **6,390.5**

4,615.9

4,561.8

Abr

3,430.5

Mar

2,960.1

2,960.1

1,937.6

Feb

1,831.8

1,831.8

3.0


Ene

3.0

DGC – Carreteras Federales Avance físico-financiero de las Obras del Bienestar




	PE	PEF 2023 (mdp)		Av. físico	Av. físico	
Obra	Modificado	Ejercido 04 de junio	Ejercido 11 de junio	global 30 abril (%)	global 31 mayo (%)	Avance financiero 2023
VER. Ozuluama-Tampico	668	346	346	82.9%	85.3%	51.9%
SLP. Cd. Valles-Tamazunchale	3,142	1,217	1,307	41.1%	43.2%	41.8%
OAX/VER. Acayucan-La						
Vent <mark>os</mark> a- <mark>Jaltipán</mark>	1,736	648	679	90.4%	91.3%	39.1%
GRO. Las Vigas-Lim. de Edos. Gro/Oax	2,704	985	989	10.7%	16.8%	36.6%
Total=	8,250	3,195	3,320			

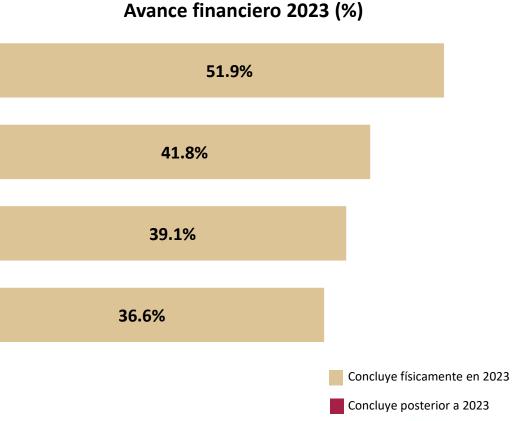



DGC – Caminos Rurales y Alimentadores Avance financiero



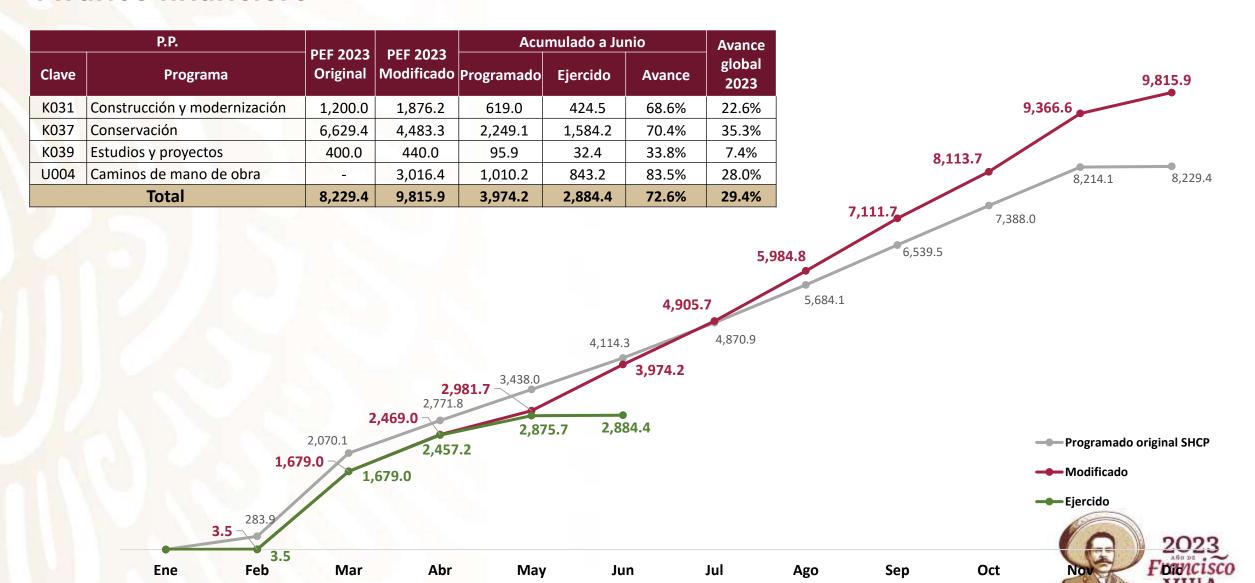

DGC – Caminos Rurales y Alimentadores Avance físico-financiero de las Obras del Bienestar



		Av. físico	Av. físico			
Obra	Modificado	Ejercido al 04 de Junio	Ejercido al 11 de Junio	global 30 abril (%)	global 31 mayo (%)	
Tayoltita - Lim. Edos. Dgo/Sin – Vado Hondo – San Júan	1,200	275	275	15.0%	21.5%	
Total=	1,200	275	275			

Avance financiero 2023 (%)

22.9 %


Concluye físicamente en 2023

Concluye posterior a 2023



Dirección General de Conservación de Carreteras Avance financiero



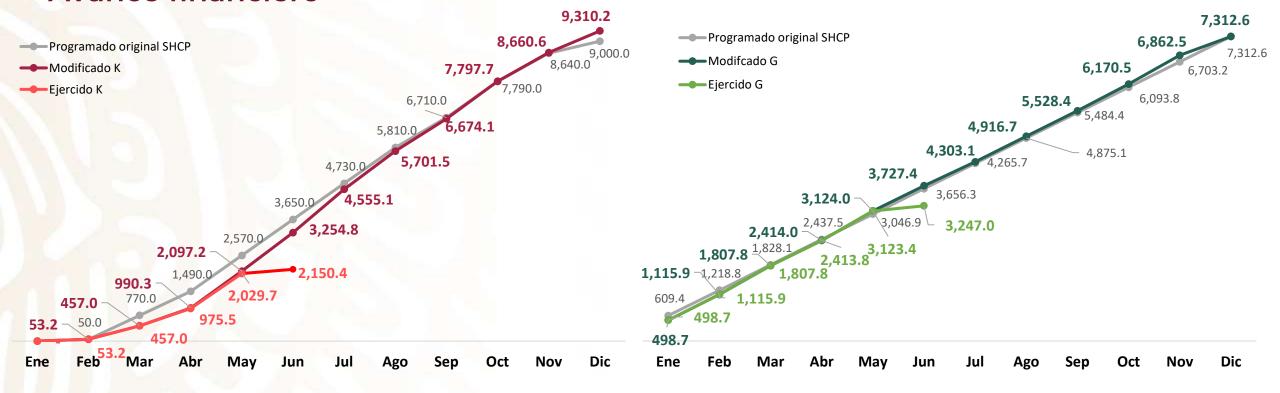

	P.P.		DEE 2022	Acun	Avance		
Clave	Programa	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Programado	Ejercido	Avance	global 2023
K032	Reconstrucción y Conservación	9,000.0	9,310.2	3,254.8	2,150.4	66.1%	23.1%
G003	APP's	7,312.6	7,312.6	3,727.4	3,247.0	87.1%	44.4%
	Total	16,312.6	16,622.8	6,982.2	5,397.4	77.3%	32.5%

^{* 350.2} mdp Ampliación liquida por Emergencias en estados de : Baja California , Baja California Sur, Colima , Chiapas, Durango, Oaxaca, Veracruz y Yucatán



Dirección General de Desarrollo Carretero Avance financiero



	P.P.		PEF 2023	Acı	Avance		
Clave	Programa	PEF 2023 Original		Programado	Ejercido	Avance	global 2023
G003	PPS y APP	6,783.9	6,783.9	3,325.8	2,684.6	80.7%	39.6%
K048	Liberación de derecho de vía	-	364.7	8.6	7.0	82.0%	1.9%
	Total	6,783.9	7,148.5	3,334.4	2,691.7	80.7%	37.7%

2,691.4

1,500.2

Mar

1,434.3

1,500.1

400.0

Feb

400.2 549.3 549.3

400.2

400.0

Ene

2,687.1

1,994.3

Abr

4,164.9

3,778.8

Jul

3,334.4

2,691.7

Jun


3,028.6

2,700.7

2,691.7


1,994.3

May

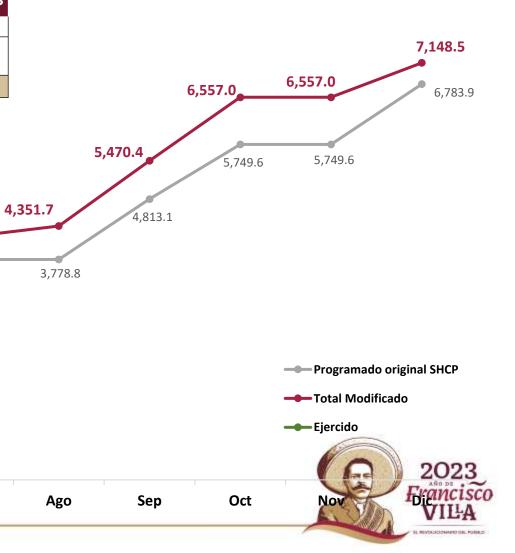

Dirección General de Servicios Técnicos Avance financiero




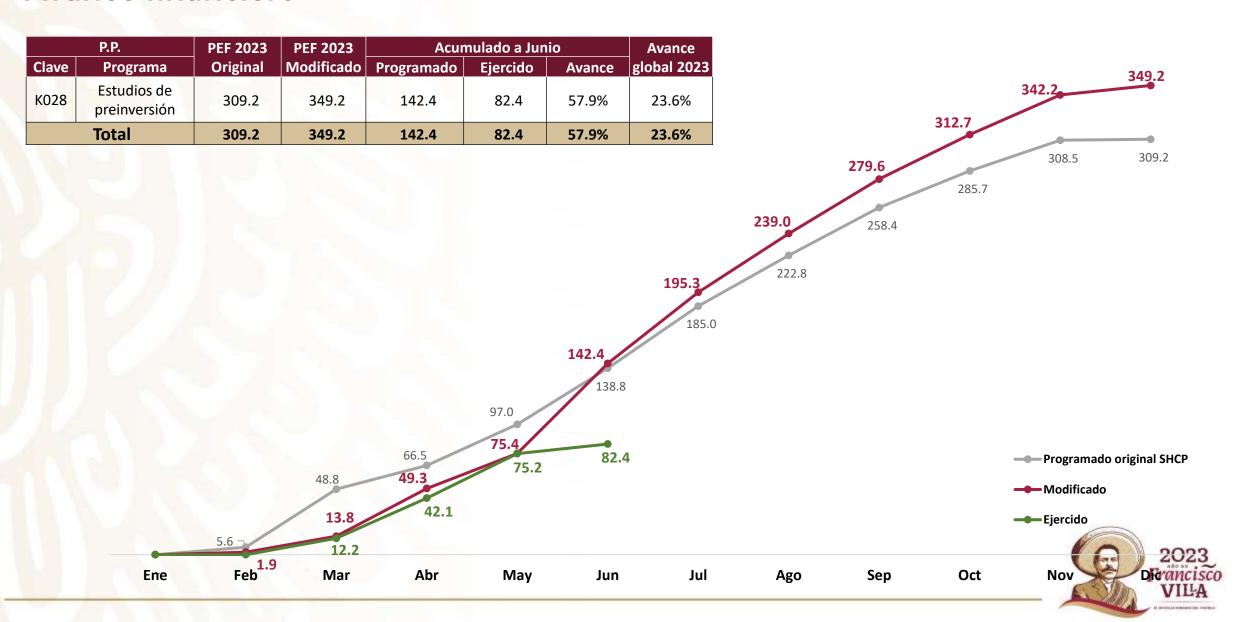


Dirección General Desarrollo Ferroviario y Multimodal Avance financiero




P.P.		PEF 2023	PEF 2023	Acumı	ılado a Ju	nio	Avance
Clave	Programa			Programado	Ejercido	Avance	global 2023
K040	Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros (Tren Interurbano México-Toluca)	7,000.0	957.6	957.3	953.7	99.6%	99.6%
K041	Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros (Trolebús Chalco- Sta Martha y Suburbano Lechería-AIFA)	4,874.4	4,874.4	2,089.8	1,432.1	68.5%	29.4%
	Total	11,874.4	5,832.0	3,047.1	2,385.8	78.3%	40.9%



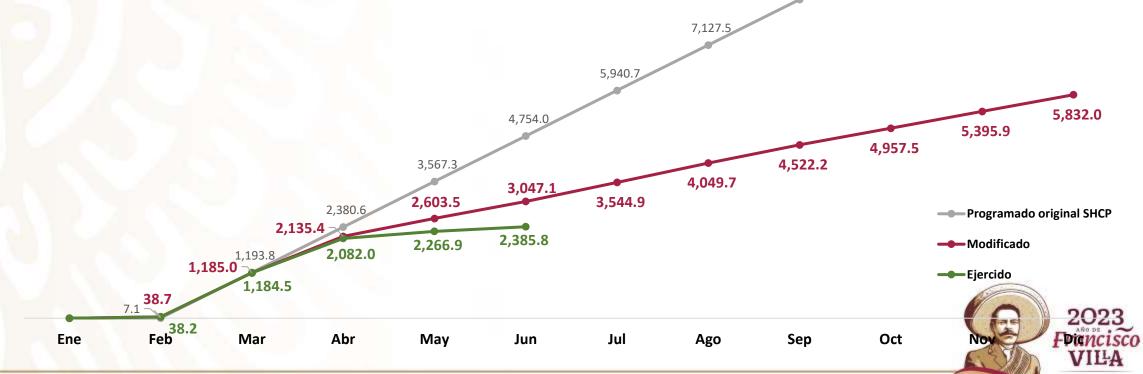

Atención a obras de Emergencias



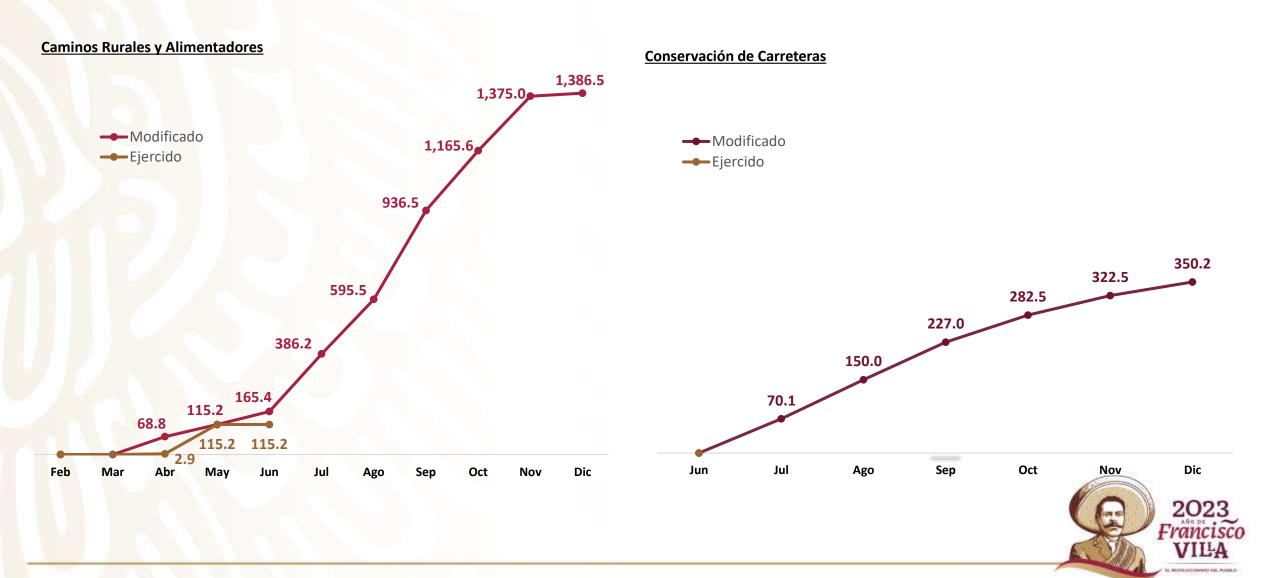

Atención a obras de Emergencias Caminos Rurales y Alimentadores 2023



Estado	Asignado	Contratado	Ejercido	Economías	Avance Financiero % *
	1,386.5	360.1	115.2	1,026.3	32.0%
Baja California Sur	65.6	0.0	0.0	65.6	0.0%
Campeche	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0%
Chiapas	154.5	2.9	2.9	151.6	100.0%
Durango	50.8	0.0	0.0	50.8	0.0%
Guanajuato	1.5	0.0	0.0	1.5	0.0%
Guerrero	91.3	0.0	0.0	91.3	0.0%
Hidalgo	102.8	0.0	0.0	102.8	0.0%
Jalisco	90.2	0.0	0.0	90.2	0.0%
Michoacán	66.3	0.0	0.0	66.3	0.0%
Nayarit	40.8	0.0	0.0	40.8	0.0%
Oaxaca	481.2	357.2	112.3	123.9	31.4%
Puebla	47.1	0.0	0.0	47.1	0.0%
Sinaloa	34.4	0.0	0.0	34.4	0.0%
Veracruz	99.7	0.0	0.0	99.7	0.0%
Yucatán	27.0	0.0	0.0	27.0	0.0%

^{* %} Corresponde al monto ejercido entre el monto contratado

Avance financiero global (32.0%)

100.0%

31.4%



Atención a obras de Emergencias Conservación de Carreteras 2023



Estado	Asignado	Contratado	Ejercido	Economías	Avance Financiero %*
	350.2	0.0	0.0	0.0	0.0%
Baja California	50.1	0.0	0.0	0.0	0.0%
Baja California Sur	55.2	0.0	0.0	0.0	0.0%
Colima	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0%
Chiapas	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0%
Durango	71.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
Oaxaca	51.7	0.0	0.0	0.0	0.0%
Veracruz	59.8	0.0	0.0	0.0	0.0%
Yucatán	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0%

Avance financiero global (0.0%)



^{* %} Corresponde al monto ejercido entre el monto contratado

Subsecretaría de Infraestructura Licitaciones con PEF 2023





Del PEF 2023 (57,865.7 mdp), se licitó el 35.5% (20,561.4 mdp).



El 57.7% del PEF (33,407.0 mdp) corresponde a APP's, PPS's, cabeceras municipales, convenios de reasignación, plurianualidades, revalidaciones, adeudos, gastos de operación, etc.



El 6.8% (3,897.3 mdp) del PEF autorizado modificado, se tiene como recurso disponible o por licitar.

Licitación Pública Nacional

664 licitaciones 19,719.8 mdp 95.9%

Invitación a 3 personas

202 licitaciones 838.6 mdp 4.1%

867 licitaciones 20,561.4 mdp

Adjudicación Directa

1 licitaciones 3.0 mdp

0.0%

Licitaciones de obra 534 / 18,964.4 mdp

Adjudicadas: 441 / 15,769.8 mdp

En proceso: 93 / 3,194.6 mdp

Licitaciones de servicios 333 / 1,597.0 mdp


Adjudicadas: 245/1,224.7 mdp

En proceso: 88 / 372.3 mdp



PEF 2023 (corte al 31 de mayo) % de avance ejercido por Centro SICT



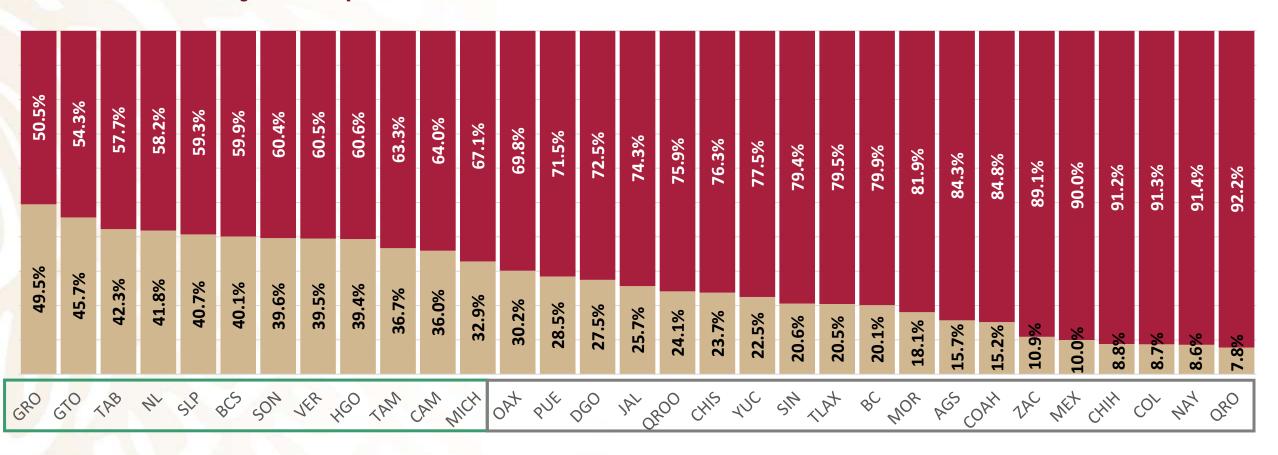



La inversión de los 31 CSICT es de 49,390.5 mdp, se ejercieron 16,054.9 mdp.



12 Centros SICT están por arriba del avance promedio (32.5%).




19 Centros SICT están por abajo del avance promedio.





PEF 2023 (corte al 31 de mayo) % de avance ejercido por Programa Presupuestal



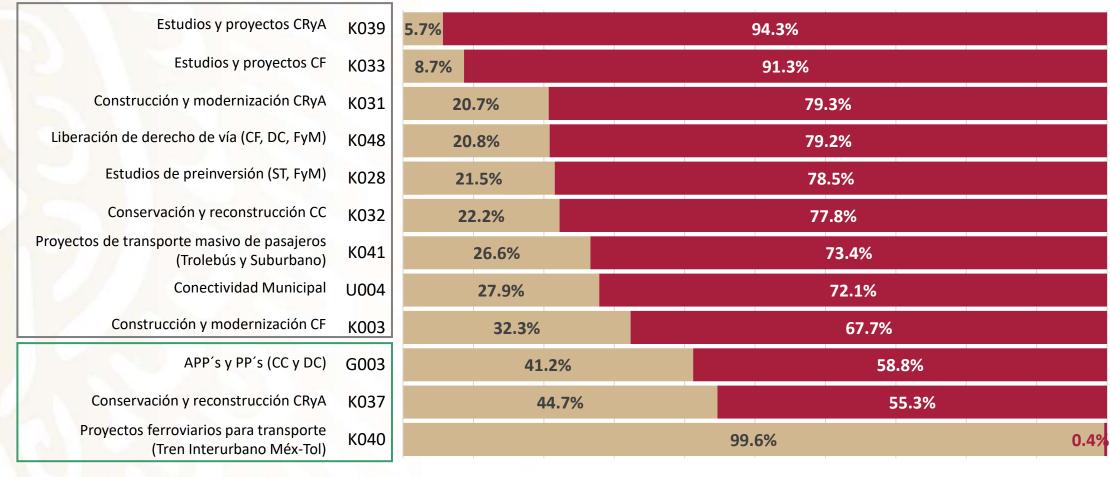



La inversión de los Programas Presupuestales es de 56,537.3 mdp, se ejercieron 18,677.2 mdp



3 Programas están por arriba del promedio (33.0%)



9 Programas están por abajo del promedio







Anexo: Reporte de Comprometido vs Disponible (mdp)





Subsecretaría de Infraestructura

Registro SHCP	Dirección General o Área	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Contratado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por comprometer)	Observaciones
	TOTAL (MDP)	61,659.7	57,865.7	49,791.2	44,160.2	5,631.0	4,174.1	3,900.4	
Direcci	ión General de Carreteras	26,379.6	27,913.2	23,229.2	20,022.5	3,206.7	2,087.9	2,596.0	
Ca	arreteras Federales	18,150.2	18,097.3	16,284.5	15,477.2	807.3	891.6	921.2	
Ci	aminos Rurales y Alimentadores	8,229.4	9,815.9	6,944.7	4,545.3	2,399.4	1,196.3	1,674.9	
Direcci	ión General Conservación de Carreteras	16,312.6	16,622.8	15,101.4	13,527.1	1,574.3	1,090.3	431.0	
Co	onservación de Carreteras Federales	9,000.0	9,310.2	7,788.8	6,258.9	1,529.9	1,090.3	431.0	
As	sociación Pública Privada	7,312.6	7,312.6	7,312.6	7,268.1	44.5	=	-	
Direcci	ión General de Desarrollo Carretero	6,783.9	7,148.5	6,792.2	6,785.3	6.9		356.4	
Direcci	ión General de Servicios Técnicos	309.2	349.2	337.3	295.2	42.1	3.7	8.2	
Direcci	ión General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal	11,874.4	5,832.0	4,331.1	3,530.1	801.0	992.1	508.8	





Dirección General de Carreteras Programa de Construcción y Modernización de Carreteras

Registro SHCP	Carretera	PEF 2023 MDP	Autorizado Modificado MDP	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por comprometer)	Observaciones
	TOTAL (MDP)	18,150.2	18,097.3	15,477.2	807.3	891.6	921.2	
BAJA CAL	IFORNIA	477.0	477.0	367.1	15.5	79.2	15.2	
20096220002	Carretera Transpeninsular, tramo del km 15+400 al km 21+600	477.0	397.0	367.0	15.5	0.0	14.5	12.8 mdp Economía y 1.7 mpd ajuste de costos
19096220001	Modernización de la carretera federal MEX-001 Ensenada - Lázaro Cárdenas, tramo: Punta Colonet - Lázaro Cárdenas	0.0	80.0	0.1	0.0	79.2	0.7	ajuste de costos
BAJA CAL	LIFORNIA SUR	329.0	329.0	324.2	4.8		-	
22096230002	Vizcaíno - Guerrero Negro	329.0	180.5	175.7	4.8	-	-	
	Vizcaíno - Guerrero Negro (Reasignación al Gob. Del Edo)	-	148.5	148.5	-			Convenio de reasignación
CHIAPAS		140.0	714.0	151.6	156.3	406.1	-	
11096270038	Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes	140.0	714.0	151.6	156.3	406.1	-	Apertura: 16-jun-2023 Se estima quede comprometido en la primera quincena de julio de 2023.
GUERRER	0	2,904.1	2,902.1	2,373.0	35.4	270.0	223.7	
8096320020	Acapulco-Zihuatanejo	200.0	198.0	159.5	4.9	-	33.6	En revisión por las partes Se estima quede comprometido en junio de 2023. Anathropoli im 2007.
22096320001	Modernización de la carretera federal Las Cruces-Pinotepa Nacional MEX-200, tramo: Las Vigas-Lím. de Edos. Gro./Oax.	2,704.1	2,704.1	2,213.4	30.6	270.0	190.1	Apertura: 01-jun-2023 Se estima quede comprometido en la primera quincena de julio de 2023.
HIDALGO		1,109.0	1,109.0	1,081.8	27.2			
12096330030	Construcción de la Carretera Real del Monte - Ent. Huasca	809.0	809.0	786.4	22.6			-
20096330001	Pachuca - Huejutla, tramo: Cerro Colorado - Zacualtipán	300.0	300.0	295.3	4.7			-
OAXACA		1,258.6	1,258.6	1,071.2	17.6		169.8	
5096400027	Acayucan - Ent. La Ventosa	1,258.6	1,258.6	1,071.2	17.6		169.8	En revisión del Proyecto por la DGC Costo previsto de trincheras 352 mdp Se estima quede comprometido en julio de 2023.
QUINTAN	A ROO	5,508.0	5,508.0	5,195.1	312.9			
22096430001	Puente Vehicular Nichupté	4,430.0	4,430.0	4,199.2	230.8	-	-	-
22096430002	Conexión entre Av. Huayacán - Carretera Federal MEX-307 Reforma Agraria - Puerto Juárez. Av. Chac Mool	177.8	177.8	176.2	1.6	-	-	-
22096430003	Rehabilitación de la Carr. MEX-307 Reforma Agraria - Puerto Juárez, Tr. Boulevard Colosio	736.6	736.6	668.4	68.2	-	-	-
22092100004	Entronque Aeropuerto Cancún	163.6	163.6	151.2	12.4	-	-	-
SAN LUIS		3,142.2	3,122.2	3,077.0	31.8		13.4	
17096440002	Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles	3,142.2	3,122.2	3,077.0	31.8	-	13.4	-
TABASCO		350.0	350.0	318.6	0.8		30.6	
13096470001	Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr. Entr. Reforma-Villahermosa	350.0	350.0	318.6	0.8	-	30.6	23.2 mdp Economía 7.4mdp ajuste de costos
VERACRU	z	1,145.0	1,145.0	986.8	40.1	103.5	14.6	
11096500018	Ozuluama-Tampico	667.7	667.7	563.6	26.2	65.0	12.9	ajuste de costos
22096500001	Libramiento Sayula	477.3	477.3	423.2	13.9	38.5	1.6	ajuste de costos



Dirección General de Carreteras Programa de Construcción y Modernización de Carreteras

Registro SHCP	Carretera	PEF 2023 MDP	Autorizado Modificado MDP	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por comprometer)	Observaciones
Programa	de Estudios y Proyectos de Carreteras Federales	500.0	500.0	246.0	164.8	32.8	56.4	Se estima comprometer en su totalidad en el mes de junio
Programa	de Derecho de Vía de Carreteras Federales	1,287.3	682.4	284.9		-	397.5	En proceso de Ejecución 203.6 mdp, por comprometer en oficinas centrales 99.5 mdp, transferencias en elaboración y en trámite 94.4 mdp



Dirección General de Carreteras Programa de Caminos Rurales y Alimentadores

Registro SHCP	Carretera	PEF 2023 MDP	Autorizado Modificado MDP	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
	TOTAL (MDP)	8,229.4	9,815.9	4,545.3	2,399.4	1,196.3	1,674.9	
DURANG	go	605.0	466.3	324.0	3.7	95.8	42.8	
22096300001	Camino Tayoltita - Lim. Edos. Dgo/Sin	605.0	274.0	272.2	1.8	-	-	-
5096300002	Los Herrera - Tamazula.	-	52.3	51.7	0.6		-	
23096300001	Camino Durango - La Flor - San Bernardino de Milpillas Chico - San Francisco de Lajas. Tramo del Km. 112+400 al Km. 146+260	-	140.0	0.1	1.3	95.8	42.8	Próximo a publicarse el 15 de Junio
GUERRE	RO		123.1	101.2	21.9	-	-	
22096320002	Construcción del Puente Vehicular y Accesos en el Km. 71+220 de la Carretera Tlapa - Marquelia	-	113.0	100.2	12.8		-	
10096320017	Ayutla-Acatepec,Tr: San José La Hacienda-Encino Amarillo	-	10.1	1.0	9.1		-	
NAYARI	т		146.3	46.3		100.0		
22096380001	Camino Ramal a Huajimic.	-	100.0	-	-	100.0	-	En proceso de Licitación
19096380001	Camino Presa del Cajón - Carretones - Aserradero de las Palas - Guadalupe Ocotán	-	15.1	15.1	-		-	
20096380001	Eje Interestatal (Tepic - Aguascalientes), tramo: Carretones - Mesa de Pajaritos - Camotlán	-	31.2	31.2	-		-	
OAXACA			34.9	34.7	0.2		-	
16096400004	Modernización a nivel de Pavimento de la Carretera E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - Santiago Quiavicusas del km 0+000 al km 23+000	-	0.2	0.2	-		-	
21096400012	Camino Marinero - Malucano - Rio Potrero, Tramo Marinero - Malucano Subtramo del Km 1+180 al Km 4+760	-	0.6	0.6	-		-	
20096400002	Camino E.C. (Sn P Amuzgos - Cacahuatepec) - Sn Antonio Ocotlán Incluye Ramal a Sn Pedro Amuzgos y Sn Martín Amuzgos (Edo Oax) - Gpe Victoria (Edo Gro)	-	34.1	34.0	0.2		-	
PUEBLA			37.1			37.1		
23096410002	Construcción del Puente Vehicular "Los Ladrillos"	-	7.9	-	-	7.9	-	En proceso de Licitación
23096410001	Construcción del Puente Vehicular Juan Manuel Rodríguez Rodríguez	-	29.2	-	-	29.2	-	En proceso de Licitación
SINALO	A	595.0	926.7	917.1	9.5	-		
18096450004	San Juan - Vado Hondo	174.0	174.0	173.2	0.8		=	
22096450001	Camino Vado Hondo - Lim. Edos. Sin/Dgo.	421.0	752.0	743.3	8.7		-	
19096450002	Construcción de Camino Rural San Ignacio - Tayoltita	-	0.7	0.7	0.0		-	
SONARA	A .		11.7	11.7		-		
14096460006	Agua Prieta - Bavispe	-	11.7	11.7	-		-	
TABASC	0		4.0	4.0				
20096470001	Puente Quintín Aráuz.	-	4.0	4.0	-		-	
VERACE	euz -		126.3	24.0	16.2	86.0		
20096500002	Camino Minatitlan - Hidalgotitlán	-	97.1	6.8	4.3	86.0		En proceso de Licitación
20096500001	Camino Zontecomatlán - Xoxocapa - Ilamatlán	-	29.1	17.2	11.9			
Program	na de Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores	6,629.4	2,996.8	1,705.1	362.2	705.1	224.4	Recursos proximos a licitarse por parte de los Centros SICT a mas tardar el mes de junio





Dirección General de Carreteras Programa de Caminos Rurales y Alimentadores

Registro SHCP	Carretera	PEF 2023 MDP	Autorizado Modificado MDP		Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
Programa Alimentad	de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y ores	400.0	440.0	133.0	73.5	125.7	107.8	Se tienen programados los fallos para el finales de mayo Se estima licitar lo restante en el mes de junio
Programa	J0004 (Caminos Rurales y Alimentadores)		3,016.4	1,103.4	1,566.5		346.4	En proceso de formalización los convenios respectivos, se espera formalizarlos en el mes de junio
Obras de E	mergencia en Caminos Rurales y Alimentadores		1,386.5	140.6	293.4		952.4	Próximo a licitarse
Convenio F	ONATUR Tren Maya y SICT		100.0		52.2	46.7	1.1	Economias de licitaciones



Dirección General de Conservación de Carreteras Programa de Conservación de Carreteras (K032)

Montos por Comprometer por Cetro SICT y por Subprograma

Entidad/Programa	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
TOTAL (MDP)	9,000.0	9,310.2	6,258.9	1,529.9	1,090.3	431.0	
OFICINAS CENTRALES (UR 211)	9,000.0	368.8	259.7	65.7	4.4	39.0	Se espera convocar a prinicipios del próximo mes
AGUASCALIENTES	-	131.5	103.7	0.7	18.8	8.3	Sigue pendiente en espera definición de proyecto
BAJA CALIFORNIA	-	339.3	190.9	36.3	62.0	50.1	Recursos de Emergencias recientemente autorizados
BAJA CALIFORNIA SUR	-	330.2	201.1	71.6	2.2	55.2	Recursos de Emergencias recientemente autorizados
CAMPECHE		188.9	175.5	6.7	6.7		
COAHUILA		335.6	256.4	36.5	42.6		
COLIMA		131.9	81.4	2.9	35.3	12.4	Recursos de Emergencias recientemente autorizados
CHIAPAS		397.0	136.4	192.0	51.3	17.2	Recursos de Emergencias recientemente autorizados
СНІНИАНИА		514.9	179.8	19.3	291.8	24.0	En espera de que nos envien Convocatoria
DURANGO		458.2	347.7	23.3	16.1	71.0	Recursos de Emergencias recientemente autorizados
GUANAJUATO		162.8	136.3	17.5	9.0		
GUERRERO		361.0	298.7	37.4	24.9		
HIDALGO		173.0	144.7	24.7	3.5		
JALISCO		451.5	368.0	63.0	20.4		
ESTADO DE MÉXICO		249.5	232.3	11.8	5.4		
MICHOACÁN		459.5	328.4	110.5	20.7		
MORELOS		101.9	75.0	19.2	7.8		
NAYARIT		166.1	106.2	50.3	9.6	-	
NUEVO LEÓN		219.9	188.1	22.1	9.7		
OAXACA		570.4	300.3	178.8	39.7	51.7	Recursos de Emergencias recientemente autorizados
PUEBLA		197.0	173.1	13.3	10.6		
QUERÉTARO		162.6	127.0	18.1	17.4		
QUINTANA ROO	-	123.0	95.3	1.3	26.3	-	



Dirección General de Conservación de Carreteras Programa de Conservación de Carreteras (K032)

Montos por Comprometer por Cetro SICT y por Subprograma

Entidad/Programa	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
SAN LUIS POTOSÍ		256.5	214.6	8.6	33.2		
SINALOA		259.2	205.1	1.0	53.1		
SONORA	-	313.3	269.5	39.5	4.4		
TABASCO		170.6	132.0	17.3	21.3		
TAMAULIPAS		330.7	271.3	22.6	36.8		
TLAXCALA		140.4	112.0	13.9	14.5		
VERACRUZ		624.5	215.5	257.1	92.1	59.8	Recursos de Emergencias recientemente autorizados
							Recursos de Emergencias recientemente
YUCATÁN		252.9	198.1	0.4	21.5	32.9	autorizados
710177010		767.5	77/6	1/66	75.0	2.	
ZACATECAS		367.5	134.6	146.6	76.8	9.4	En espera de que nos envien Convocatoria



Dirección General de Desarrollo Carretero Programa Presupuestal G003 y K048

Registro SHCP	Obra o Proyecto	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
	TOTAL (MDP)	6,783.9	7,148.5	6,785.3	6.9	-	356.4	
G003	3 PROYECTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	6,648.2	6,648.2	6,641.3	6.9			
CHS	Tapachula-Talisman	409.5	409.5	409.5	-	-	-	
GTO	Irapuato-La Piedad	411.7	411.7	411.7	-	-	-	
GTO	Querétaro-Irapuato	-	1,399.4	1,399.4	-	-	-	
MICH	Nueva Italia Nueva Italia - Apatzingán	203.6	203.6	203.6	-	-	-	
OAX	Autopista Mitla-Tehuantepec	2,646.7	2,646.7	2,646.7	-	-	-	
PUE	Nuevo Necaxa - Avila Camacho	888.7	888.7	881.8	6.9	-	-	
QRO	Querétaro-Irapuato	1,399.4	-	-	-	-	-	
SLP	Rio Verde-Ciudad Valles	688.5	688.5	688.5	-	-	-	
G003	3 ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA	135.7	135.7	135.7				
PUE	APP Libramiento de la carretera La Galarza-Amatitlanes	135.7	135.7	135.7	-	-	-	
K048	B LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA	-	364.7	8.3			356.4	
22092140001	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	-	1.2	1.1	-	-	0.1	Recursos que se ejercerar de manera periodica conforme al pago del mismo.
22092140001	Servicios bancarios y financieros	-	7.5	7.2	-	-	0.3	Recursos que se ejercerar de manera periodica conforme al pago del mismo.
22092140001	Otros impuestos y derechos	-	0.0	0.0	-	-	-	
22092140001	Servicios para la liberacion de derechos de via	-	356.0				356.0	110.48 MDP se tienen en tramite de transferencia para el pago de sentacias por Autopista La Pera Cuautla, 70.45 MDP se tienen pendientes de tramitar para ser transferidos al K033 y 175.06 MDP se tienen pendientes para otros pagos que no se han definido.



Dirección General de Servicios Técnicos Programa Presupuestal K028

Montos por Comprometer

Registro SHCP	Obra o Proyecto	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
	TOTAL (MDP)	309.2	349.2	295.2	42.1	3.7	8.2	
K028 ES	TUDIOS DE PREINVERSIÓN	309.2	349.2	295.2	42.1	3.7	8.2	
22092120001	Evaluación de los elementos funcionales, estructurales y de seguridad vial de la Red Carretera Federal (RCF) en 2023, a través de su auscultación	94.5	134.5	88.7	42.1	3.7	-	
22092120002	Actualización de normas, manuales técnicos y Tabuladores de Precios Unitarios y de Costos Paramétricos 2023.	39.3	39.3	35.6	-	=	3.7	Para los recurso por licitar, se tiene programada la publicacion de la convocatoria el 20 de junio de 2023
22092120003	Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la RCF en 2023	67.9	67.9	65.7	-	-	2.2	Para los recurso por licitar, se tiene programada la publicacion de la convocatoria el 20 de junio de 2023
22092120004	Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera a cargo de la SICT, en el año 2023	107.6	107.6	105.3	-	-	2.3	



Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal Programa Presupuestal K040 y K041 Montos por Comprometer en obras (Cifras SICOP)

Registro SHCP	Obra o Proyecto	PEF 2023 Original	PEF 2023 Modificado	Comprometido total en SICOP	Contratado sin registrar en sistema SICOP	En proceso de licitación	Por licitar o Disponible (Por	Observaciones
	TOTAL (MDP)	11,874.4	5,832.0	3,530.1	801.0	992.1	508.8	
TREN IN	TERURBANO MEXICO TOLUCA	7,000.0	957.6	953.7		3.9		
13093110008 Tre	en Interurbano Mexico Toluca SICT	7,000.0	7.6	3.7	-	3.9	-	Los recursos del proyecto se consideran para el pago de servicios de energía eléctrica de las estaciones.
13093110008 Co	nvenio de Reasignación CDMX	-	950.0	950.0		-	-	
SUBURB	SANO RAMAL LECHERIA AIFA	1,250.0	2,650.0	534.3	801.0	924.4	390.3	
20093110004 Lib	peracion De Derecho De Via	-	298.0	182.3	-	115.7	-	En el proyecto del Tren Suburbano AIFA, se tienen recursos comprometidos en SICOP por 534.1 mdp, asimismo, se cuenta con recursos contratados por 801.1 mdp, que por movimientos presupuestales no han sido capturados en SICOP, de los cuales 473.22 mdp corresponden a los contratos del 2023 y 327.9 mdp a
20093110004 Ob	oras Civiles y Servicios (Supervisión, Estudios y Proyectos)	1,250.0	2,141.9	352.0	801.0	598.6	390.3	pagos de contratos plurianuales. En proceso de licitación se consideran 924.4 mdp para la construcción de 4 pasos vehiculares , trabajos de reubicación y reconfiguración del acueducto los Reyes Ecatepec, adquisición de
20093110004 Ma	tterial De Via	-	210.1	-		210.1	-	materiales y Liberación del Derecho de Vía. Los fallos y las firmas de los contratos se tiene estimado hacerlas entre el 1 de junio y el 15 de junio de 2023. Se cuenta con 390.3 mdp, programados para licitar en el mes de
SIT CHAI	LCO SANTA MARTHA	3,624.4	2,224.4	2,042.1		63.8	118.5	
21093110007 Dir	rección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal	3,624.4	118.5	-	-	-	118.5	118.5 mdp son economías.
21093110007 Cer	ntro SICT Estado de México	-	1,400.0	1,336.2	-	63.8	-	Recursos a cargo del Centro SICT del Estado de México, de los cuales 63.8 mdp en proceso de Licitación
21093110007 Co	nvenio de Reasignación CDMX	-	705.9	705.9	-	-		705.9 mdp fueron reasignados la Gobierno de la Ciudad de México para la ejecución del proyecto.








Contratado vs Pendiente y Comprometido vs Disponible

Contratado vs Pendiente

Área	PEF 202	3 (SICOP)	Contratado	En proceso de	por licitar	
Alea	Original	Original Modificado		licitación	por licital	
Total SSI	61,659.7	57,865.7	49,791.2	4,174.1	3,900.4	
Subsector Carretero	49,785.3	52,033.7	45,460.1	3,182.0	3,391.6	
Carreteras Federales	18,150.2	18,097.3	16,284.5	891.6	921.2	
Caminos Rurales y Alimentadores	8,229.4	9,815.9	6,944.7	1,196.3	1,674.9	
Conservación de Carreteras	16,312.6	16,622.8	15,101.4	1,090.3	431.0	
Desarrollo Carretero	6,783.9	7,148.5	6,792.2	-	356.4	
Servicios Técnicos	309.2	349.2	337.3	3.7	8.2	
		•	•			
Subsector Ferroviario	11,874.4	5,832.0	4,331.1	992.1	508.8	
Ferroviario y Multimodal	11,874.4	5,832.0	4,331.1	992.1	508.8	



Comprometido vs Disponible

Área	PEF 2023 (SICOP)		Comprometido	Contratado sin	En proceso de	por licitar
Aled	Original	Modificado	total en SICOP	registrar en	licitación	por licital
Total SSI	61,659.7	57,865.7	44,160.2	5,631.0	4,174.1	3,900.4
Subsector Carretero	49,785.3	52,033.7	40,630.1	4,830.0	3,182.0	3,391.6
Carreteras Federales	18,150.2	18,097.3	15,477.2	807.3	891.6	921.2
Caminos Rurales y Alimentadores	8,229.4	9,815.9	4,545.3	2,399.4	1,196.3	1,674.9
Conservación de Carreteras	16,312.6	16,622.8	13,527.1	1,574.3	1,090.3	431.0
Desarrollo Carretero	6,783.9	7,148.5	6,785.3	6.9	-	356.4
Servicios Técnicos	309.2	349.2	295.2	42.1	3.7	8.2
Subsector Ferroviario	11,874.4	5,832.0	3,530.1	801.0	992.1	508.8
Ferroviario y Multimodal	11,874.4	5,832.0	3,530.1	801.0	992.1	508.8

