## CHIS. Modernización de la carretera Palenque – San Cristóbal de Las Casas.



## Características de la obra:


 Modernización de 182.5 Km de carretera con un ancho de corona de 7 m, mediante trabajos de conservación periódica, mejora de alineamiento y rectificación de curvas.

## MODERNIZAR 182.5 KM (CONSERVACIÓN PERIÓDICA)

MONTO Y META TOTAL	3,479.4	182.5 km
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN ( mdp )	META ( km - estructura )
Hasta 2021	557.6	64.5 km (conservación periódica) y reforzamiento de 9 puentes
PEF 2022	770.0	79.0 km (conservación periódica)
Posterior 2022	2,151.8	39.0 km (conservación periódica)

Avance Global al 28 de febrero de 2022		
Avance físico:	<b>39.9</b> %	
Avance financiero:	<b>17.3</b> %	

Elementos TELAS		
<b>Técnica</b> (Proyecto Ejecutivo)	85.0 % Falta del km 182+500 al km 209+700	
Económica (Registro UI-SHCP)	Vigente hasta 2022 (15096270004)	
<b>Legal</b> (Derecho de Vía)	Se cuenta con el derecho de vía histórico	
Ambiental	85.0 % Falta exención del km 182+500 al km 209+700	
Social	Sin problema	

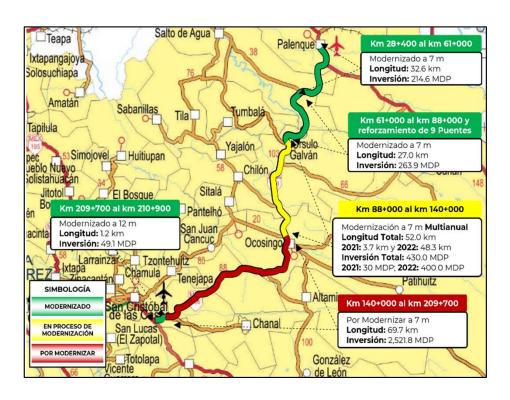

## **Beneficios**

- Detonará la economía y el turismo en el estado de Chiapas, ahorros en tiempo de recorrido, reduce accidentes, y se comunica al nuevo Aeropuerto de Palenque.
- Integra un circuito carretero que conecta los principales destinos turísticos de estado de Chiapas.
- Se generan 16,007 empleos directos y 64,026 empleos indirectos.
- Población Beneficiada 1,200,000 habitantes.
